

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO											
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	0,12	13.147,00	3.150,00	1.197,69	4.347,69	1.577,64	378,00	143,72	521,72	
1.2	DEMOLIÇÃO											
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	55,88	64,26	43,12	-	43,12	3.590,85	2.409,55	-	2.409,55	
2.0	MURO											
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	37,62	52,29	1,38	107,59	108,97	1.967,15	51,92	4.047,54	4.099,46	
2.2	ALVENARIA											
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	54,51	412,20	412,19	126,14	538,33	22.469,02	22.468,72	6.875,65	29.344,37	
2.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	78,74	105,30	101,49	-	101,49	8.291,32	7.991,32	-	7.991,32	
2.3	CONCRETO ARMADO											
2.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.786,22	23,21	10,07	-	10,07	64.668,17	28.057,24	-	28.057,24	
2.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.671,73	18,18	2,45	0,01	2,46	30.392,05	4.095,74	16,72	4.112,46	
2.4	CHAPISCO E REBOCO											
2.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	10,07	1.244,40	895,23	183,23	1.078,46	12.531,11	9.014,96	1.845,14	10.860,10	
2.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	43,34	1.244,40	378,18	453,74	831,92	53.932,30	16.390,28	19.665,13	36.055,41	

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99514-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.06.04 10:48:55
-03'00'

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.5	PINTURA						-				
2.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,97	1.244,40	725,81	235,02	960,83	4.940,27	2.881,47	933,03	3.814,50
2.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,83	1.244,40	725,81	235,02	960,83	14.721,25	8.586,33	2.780,29	11.366,62
3.0	ARQUIBANCADA										
3.1	TRBALHOS EM TERRA										
3.1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	37,62	4,57	4,57	26,51	31,08	171,92	171,92	997,31	1.169,23
3.1.2	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	62,14	40,32	32,76	44,94	77,70	2.505,48	2.035,71	2.792,57	4.828,28
3.2	ALVENARIA										
3.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	78,74	102,96	102,96	160,97	263,93	8.107,07	8.107,07	12.674,78	20.781,85
3.3	CONCRETO ARMADO										
3.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.786,22	3,26	0,76	-	0,76	9.083,08	2.117,53	-	2.117,53
3.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.671,73	6,09	-	-	-	10.180,84	-	-	-
3.4	CHAPISCO E REBOCO										
3.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	10,07	149,76	168,00	244,77	412,77	1.508,08	1.691,76	2.464,83	4.156,59
3.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	43,34	149,76	168,00	244,77	412,77	6.490,60	7.281,12	10.608,33	17.889,45

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emidio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840

Assinado de forma digital
por PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840
Dados: 2025.06.04 10:49:08
-03'00"

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
3.5	PINTURA											
3.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,97	149,76	392,58	20,19	412,77	594,55	1.558,54	80,15	1.638,69	
3.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,83	149,76	392,58	20,19	412,77	1.771,66	4.644,22	238,85	4.883,07	
3.6	PISO E CONTRAPISO											
3.6.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 14 B.	M2	74,68	108,00	135,87	18,53	154,40	8.065,44	10.146,77	1.383,82	11.530,59	
3.6.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	41,55	108,00	188,47	26,70	215,17	4.487,40	7.830,93	1.109,39	8.940,32	
4.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO											
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	37,62	43,23	81,85	-	81,85	1.626,31	3.079,20	-	3.079,20	
4.2	ALVENARIA											
4.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	54,51	322,00	358,57	-	358,57	17.552,22	19.545,65	-	19.545,65	
4.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	78,74	193,20	160,95	40,77	201,72	15.212,57	12.673,20	3.210,23	15.883,43	
4.3	CONCRETO ARMADO											
4.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.786,22	7,93	14,58	0,15	14,73	22.094,72	40.623,09	417,93	41.041,02	
4.4	CHAPISCO E REBOCO											
4.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	10,07	644,00	867,85	3,68	871,53	6.485,08	8.739,25	37,06	8.776,31	
4.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	43,34	644,00	867,85	3,68	871,53	27.910,96	37.612,62	159,49	37.772,11	

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.286.887/0001-60

81 99614-4011
81 9590-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.06.04 10:49:21
-03'00"

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
4.5	PINTURA											
4.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,97	644,00	912,41	2,96	915,37	2.556,68	3.622,27	11,75	3.634,02	
4.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,83	644,00	169,39	745,98	915,37	7.618,52	2.003,88	8.824,94	10.828,82	
4.6	TELA DE PROTEÇÃO											
4.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA CONFECCIONADA COM FIOS GALVANIZADOS Nº 12	M2	49,66	772,80	445,09	-	445,09	38.377,25	22.103,17	-	22.103,17	
5.0	REDE DE PROTEÇÃO											
5.1	INSTALAÇÃO DE POSTE											
5.1.1	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	623,21	6,00	6,00	-	6,00	3.739,26	3.739,26	-	3.739,26	
5.2	TELA DE PROTEÇÃO											
5.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA COM FIO 4	M2	27,13	732,00	228,00	-	228,00	19.859,16	6.185,64	-	6.185,64	
6.0	PISTA DE COOPER E CALÇADA											
6.1	MEIO FIO											
6.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	56,70	328,00	-	30,80	30,80	18.597,60	-	1.746,36	1.746,36	
6.2	PISO INTERTRAVADO											
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	56,85	1.874,15	939,94	257,75	1.197,69	106.545,43	53.435,59	14.653,09	68.088,68	
7.0	ILUMINAÇÃO											
7.1	POSTES											
7.1.1	POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/5M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	1.038,41	20,00	18,00	-	18,00	20.768,20	18.691,38	-	18.691,38	

Gertúlio Arimateo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 001/2024

CNPJ
10.296.887/0001-30

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

**PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400**

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.06.04 10:49:35
-03'00'

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO N° 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO N° PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
7.1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	638,39	20,00	18,00	-	18,00	12.767,80	11.491,02	-	11.491,02
7.1.3	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	126,78	20,00	18,00	-	18,00	2.535,60	2.282,04	-	2.282,04
7.1.4	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,75	20,00	18,00	-	18,00	135,00	121,50	-	121,50
7.1.5	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2. INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	5,28	660,00	330,00	-	330,00	3.484,80	1.742,40	-	1.742,40
7.2	ENTRADA DE ENERGIA										
7.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1.338,51	1,00	-	-	-	1.338,51	-	-	-
7.2.2	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	623,21	1,00	-	-	-	623,21	-	-	-


Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.06.04 10:49:48
-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
8.0	ITENS DE SERRALHARIA											
8.1	BARRAS											
8.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY, TUBO 4 POL, REF. 413, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	4.052,75	1,00	1,00	-	1,00	4.052,75	4.052,75	-	4.052,75	
8.2	PORTÕES											
8.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M2	462,14	9,60	9,60	-	9,60	4.436,54	4.436,54	-	4.436,54	
								610.365,42	404.091,55	97.718,10	501.809,65	


Valor do Boletim: NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS


Gertulio Zimoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598
400
Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
Dados: 2025.06.04 10:49:58 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 11

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO N° PE20241081871

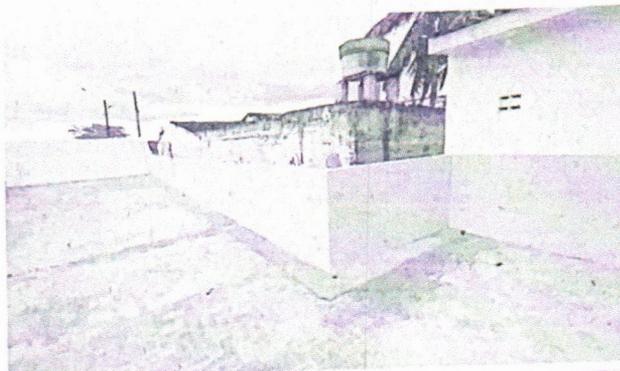

Gertúlio Timoteo Bezerra
Gertúlio Timoteo Bezerra
Sociedade de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

Gustavo de Aratijo Lima
Gustavo de Aratijo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1
