



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO											
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	0,12	13.147,00	-	-	-	1.577,64	-	-	-	-
2.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO											
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	36,24	36,24	-	36,24	1.104,23	1.104,23	-	-	1.104,23
2.2	ALVENARIA											
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	49,11	268,00	267,99	-	267,99	13.161,48	13.160,99	-	-	13.160,99
2.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	87,24	160,80	160,80	-	160,80	14.028,19	14.028,19	-	-	14.028,19
2.3	CONCRETO ARMADO											
2.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,48	6,80	6,80	-	6,80	16.243,27	16.234,87	-	-	16.234,87
2.4	CHAPISCO E REBOCO											
2.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	536,00	536,00	-	536,00	4.373,76	4.373,76	-	-	4.373,76
2.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	35,10	536,00	536,00	-	536,00	18.813,60	18.813,60	-	-	18.813,60
2.5	PINTURA											
2.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,96	536,00	-	605,68	605,68	2.122,56	-	2.398,49	2.398,49	
2.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,79	536,00	-	605,68	605,68	6.319,44	-	7.140,97	7.140,97	
2.6	TELA DE PROTEÇÃO											

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

BARROS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:139620010001
 69

Assinado de forma digital
 por BARROS CONSTRUÇÕES
 LTDA:13962001000169
 Dados: 2025.08.13 17:24:38
 -03'00'

GUSTAVO DE ARAUJO
 GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:1162668
 5479
 LIMA:11626685479
 2025.08.13
 21:54:19-03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA CONFECCIONADA COM FIOS GALVANIZADOS Nº 12	M2	50,28	321,60	429,00	-	429,00	16.170,05	21.570,12	-	21.570,12
3.0	VESTIÁRIO										
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	1,69	3,71	-	3,71	51,49	113,04	-	113,04
3.2	ALVENARIA										
3.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	49,11	61,80	79,37	-	79,37	3.035,00	3.897,87	-	3.897,87
3.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	87,24	5,64	5,64	-	5,64	492,03	492,03	-	492,03
3.3	CONCRETO ARMADO										
3.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,48	1,55	0,87	-	0,87	3.700,59	2.077,11	-	2.077,11
3.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACIONES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.598,15	1,00	0,93	-	0,93	1.598,15	1.486,29	-	1.486,29
3.4	LAJE										
3.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA	M2	177,84	20,46	33,77	-	33,77	3.638,61	6.005,66	-	6.005,66
3.5	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO										
3.5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	113,82	206,91	-	206,91	928,77	1.688,39	-	1.688,39
3.5.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	35,10	100,71	206,91	-	206,91	3.534,92	7.262,55	-	7.262,55

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

BARROS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:13962001
 000169

Assinado de forma
 digital por BARROS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:13962001000169
 Dados: 2025.08.13
 17:24:58 -03'00'

GUSTAVO DE GUSTAVO DE
 ARAUJO ARAUJO
 LIMA:1162668 LIMA:11626685479
 5479 2025.08.13
 21:54:19-03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.5.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	30,75	13,11	-	-	-	403,13	-	-	-
3.6	TELHADO										
3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,18	20,46	27,98	27,98	55,96	1.640,48	-	-	-
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,63	20,46	27,98	27,98	55,96	994,97	-	-	-
3.7	PORTAS										
3.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	916,59	1,00	-	2,00	2,00	916,59	-	1.833,18	1.833,18
3.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	956,13	1,00	-	-	-	956,13	-	-	-
3.8	REVESTIMENTO TETO										
3.8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	41,52	17,64	-	-	-	732,41	-	-	-
3.9	PINTURA										
3.9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,96	100,71	-	-	-	398,81	-	-	-
3.9.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,79	100,71	-	-	-	1.187,37	-	-	-
3.9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,89	17,64	-	-	-	192,10	-	-	-

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

BARROS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:1396200100
 0169

Assinado de forma digital
 por BARROS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:13962001000169
 Dados: 2025.08.13 17:25:10
 -03'00'

GUSTAVO DE GUSTAVO DE
 ARAUJO ARAUJO
 LIMA:1162668
 5479 LIMA:11626685479
 2025.08.13
 21:54:19-03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA


LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.9.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAQ.	M2	17,63	6,30	-	-	-	111,07	-	-	-
3.10	PISO E CONTRAPISO										
3.10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 148.	M2	33,33	17,64	-	-	-	587,94	-	-	-
3.10.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	33,65	17,64	-	-	-	593,59	-	-	-
3.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	51,77	17,64	-	-	-	913,22	-	-	-
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
3.11.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIA CAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	102,98	2,00	2,00	2,00	4,00	205,96	-	-	-
3.11.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	87,76	2,00	2,00	2,00	4,00	175,52	-	-	-
3.11.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	114,86	2,00	2,00	2,00	4,00	229,72	-	-	-
3.11.4	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	157,54	3,00	3,00	3,00	6,00	472,62	-	-	-


Gertúlio Timoteo Bezerra
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

BARROS
CONSTRUCOES
 LTDA:1396200100
 0169

Assinado de forma digital
 por BARROS
 CONSTRUCOES
 LTDA:13962001000169
 Dados: 2025.08.13 17:25:24
 -03'00'

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:1162668
 5479

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:11626685479
 2025.08.13
 21:54:19-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.11.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1.316,88	1,00	-	-	-	1.316,88	-	-	-
3.11.6	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	504,80	1,00	-	-	-	504,80	-	-	-
3.11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,55	1,00	-	-	-	60,55	-	-	-
3.11.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,70	2,00	-	-	-	25,40	-	-	-
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
3.12.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	60,35	2,00	-	-	-	120,70	-	-	-
3.12.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB COLETOR.	PT	87,75	1,00	-	-	-	87,75	-	-	-
3.12.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	80,53	1,00	-	-	-	80,53	-	-	-
3.12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	783,09	1,00	-	-	-	783,09	-	-	-
3.13	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE										
3.13.1	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PE15, ELJANE, PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	33,21	13,11	81,15	-	81,15	435,38	2.695,00	-	2.695,00

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

BARROS
CONSTRUCOES
LTDA:139620010001
69

Assinado de forma digital
por BARROS CONSTRUÇÕES
LTDA:13962001000169
Dados: 2025.08.13 17:25:36
-03'00'

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162668
5479
GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626685479
2025.08.13
21:54:19-03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
3.14	LOUCAS SANITÁRIAS											
3.14.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35.5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	294,95	1,00	-	-	-	294,95	-	-	-	-
3.14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	430,25	1,00	-	-	-	430,25	-	-	-	-
4.0	ARQUIBANCADA											
4.1	TRBALHOS EM TERRA											
4.1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	4,57	27,85	27,85	55,70	139,25	-	-	-	-
4.1.2	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	62,93	40,32	87,69	87,69	175,38	2.537,34	-	-	-	-
4.2	ALVENARIA											
4.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	87,24	102,96	102,96	-	102,96	8.982,23	8.982,23	-	-	8.982,23
4.3	CONCRETO ARMADO											
4.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,48	3,26	-	2,64	2,64	7.783,18	-	6.302,95	6.302,95	6.302,95
4.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.598,15	6,09	-	2,09	2,09	9.732,73	-	3.340,13	3.340,13	3.340,13
4.4	CHAPISCO E REBOCO											
4.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	149,76	173,18	-	173,18	1.222,04	1.413,15	-	-	1.413,15

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

BARROS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:13962001000169

Assinado de forma digital por
 BARROS CONSTRUÇÕES
 LTDA:13962001000169
 Dados: 2025.08.13 17:25:50
 -03'00'

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:1162668
 5479
 GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:11626685479
 2025.08.13
 21:54:19-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO N° PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13, COM 2.0 CM DE ESPESSURA.	M2	35,10	149,76	173,18	-	173,18	5.256,58	6.078,62	-	6.078,62
4.5	PINTURA										
4.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,96	149,76	-	-	-	593,05	-	-	-
4.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,79	149,76	-	-	-	1.765,67	-	-	-
4.6	PISO E CONTRAPISO										
4.6.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 148.	M2	60,49	108,00	-	-	-	6.532,92	-	-	-
4.6.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	33,65	108,00	85,80	-	85,80	3.634,20	2.887,17	-	2.887,17
5.0	PISTA DE COOPER										
5.1	MEIO FIO										
5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M3	56,51	184,84	184,84	-	184,84	10.445,31	10.445,31	-	10.445,31
5.2	PISO INTERTRAVADO										
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	56,60	580,00	580,00	-	580,00	32.828,00	32.828,00	-	32.828,00
6.0	REDE DE PROTEÇÃO										
6.1	INSTALAÇÃO DE POSTE										
6.1.1	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1.40M. INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	504,80	10,00	-	6,00	6,00	5.048,00	-	3.028,80	3.028,80

Gertúlio Linoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

BARROS
CONSTRUCOES
LTDA:139620010001
69

Assinado de forma digital
por BARROS CONSTRUÇOES
LTDA:13962001000169
Dados: 2025.08.13 17:26:04
-03'00'

GUSTAVO DE GUSTAVO DE
ARAUJO ARAUJO
LIMA:1162668 LIMA:11626685479
2025.08.13
5479 21:54:19-03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
6.2	TELA DE PROTEÇÃO												
6.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA COM FIO 4 MALHA 15X15	M2	20,83	1.608,00	-	112,00	112,00	33.494,64	-	2.332,96	2.332,96		
7.0	ITENS DE SERRALHARIA												
7.1	BARRAS												
7.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY, TUBO 4 POL, REF. 413, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	3.287,88	1,00	-	-	-	3.287,88	-	-	-		
7.2	PORTÕES												
7.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M2	374,34	2,10	-	-	-	786,11	-	-	-		
								259.814,82	177.638,19	26.377,48	204.015,67		

Valor do Boletim: VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS


Gertulio Imoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 031/2024

BARROS
 CONSTRUÇOES
 LTDA:1396200100016
 9

Assinado de forma digital
 por BARROS CONSTRUÇOES
 LTDA:13962001000169
 Dados: 2025.08.13 17:26:16
 -03'00'

GUSTAVO DE GUSTAVO DE
 ARAUJO ARAUJO
 LIMA:1162668 LIMA:11626685479
 5479 2025.08.13
 21:54:19-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES




CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO N°PE20241081895

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

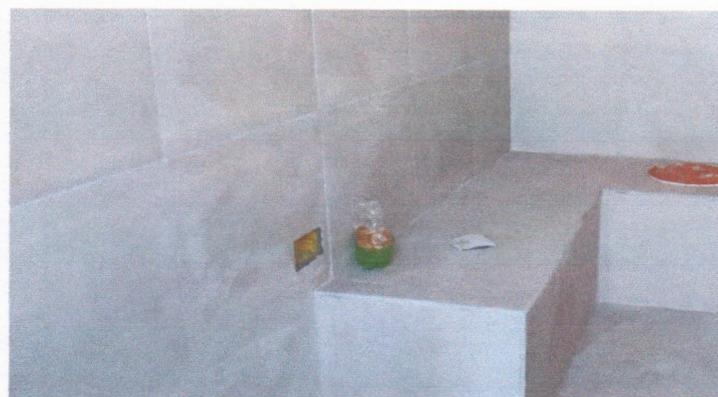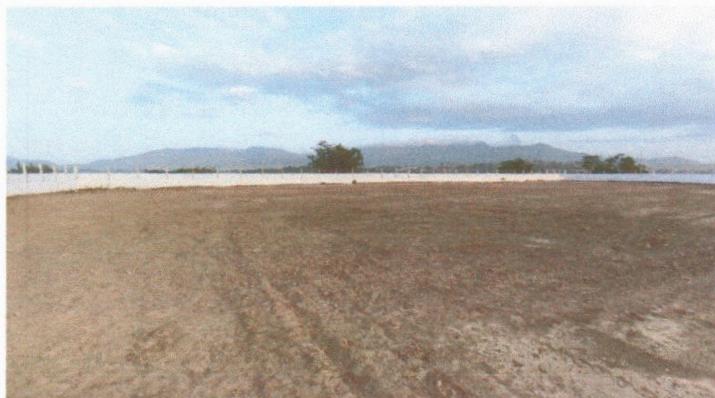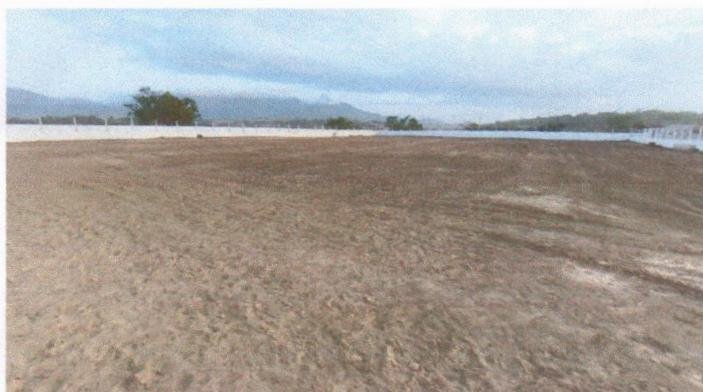




Gerulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024
