



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA										
1.1.1	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELO ORGÃO	M2	R\$ 321,89	10,00		10,00	10,00	3.218,90	0,00	3.218,90	3.218,90
2.0	CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO										
2.1	MOVIMENTOS EM TERRA										
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF02/2021	M3	R\$ 82,58	3,68	8,85		8,85	303,89	730,83	0,00	730,83
2.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	M3	R\$ 91,05	9,83		9,83	9,83	895,02	0,00	895,02	895,02
2.2	ESTRUTURA										
2.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (OS USOS)	M3	R\$ 2.264,31	4,25	4,25		4,25	9.623,32	9.623,32	0,00	9.623,32
2.2.2	CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM VÃO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATÉ 150 KG/M2	M2	R\$ 166,39	52,11		19,52	19,52	8.670,58	0,00	3.247,93	3.247,93
2.3	ALVENARIA PAREDES										
2.3.1	ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 88,23	3,87	27,36		27,36	341,45	2.413,97	0,00	2.413,97
2.3.2	ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ	M2	R\$ 69,76	116,45	120,69		120,69	8.123,55	8.419,33	0,00	8.419,33
2.3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	R\$ 31,24	13,70	6,50		6,50	427,99	203,06	0,00	203,06
2.3.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	R\$ 30,45	8,00		0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00
2.4	TELHADO										

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162679
2025.09.09
685479 23:17:28-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 051/2024

CNPJ 10.766.697/0001-80 11 33814-6091 11 3380-0181 gertulio@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 57 CEP 54.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Maria Aparecida
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056502
AN: 181955768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	R\$ 88,86	58,29	56,00		56,00	5.179,65	4.976,16	0,00	4.976,16
2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	R\$ 56,56	58,29	56,00		56,00	3.296,88	3.167,36	0,00	3.167,36
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO										
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 32,93	79,66		0,00	0,00	2.623,34	0,00	0,00	0,00
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
2.6.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	R\$ 232,95	2,00		2,00	2,00	465,90	0,00	465,90	465,90
2.6.2	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA CONJUGADA (1 S + 1 T) COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	R\$ 272,76	1,00		1,00	1,00	272,76	0,00	272,76	272,76
2.6.3	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	R\$ 241,58	1,00		1,00	1,00	241,58	0,00	241,58	241,58
2.6.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	R\$ 272,10	1,00		1,00	1,00	272,10	0,00	272,10	272,10
2.6.5	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	R\$ 250,55	6,00		6,00	6,00	1.503,30	0,00	1.503,30	1.503,30
2.6.6	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	R\$ 319,98	6,00		6,00	6,00	1.919,88	0,00	1.919,88	1.919,88
2.6.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	R\$ 40,99	6,00		6,00	6,00	245,94	0,00	245,94	245,94

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162679
2025.09.09
23:17:28-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

CNPJ 30.882/0001-00 01 98810-4001 01 9890-2187 gabriela@vertentes.pe.gov.br Dr. Emília Cavalcanti, nº 87 CIP 55.770-000 Centro | Vertentes-PE

Maria Aparecida
Engenheira
Qualidade de Segurança
CREAT 054597
AN 153.164.766



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.6.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 134,90	1,00		1,00	1,00	134,90	0,00	134,90	134,90
2.6.9	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 231,22	1,00		1,00	1,00	231,22	0,00	231,22	231,22
2.6.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 165,07	1,00		1,00	1,00	165,07	0,00	165,07	165,07
2.6.11	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 53,39	1,00		1,00	1,00	53,39	0,00	53,39	53,39
2.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 15,65	1,00		1,00	1,00	15,65	0,00	15,65	15,65
2.6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 16,26	2,00		2,00	2,00	32,52	0,00	32,52	32,52
2.6.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 17,64	1,00		1,00	1,00	17,64	0,00	17,64	17,64
2.6.15	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 45,98	1,00		1,00	1,00	45,98	0,00	45,98	45,98
2.7	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA										
2.7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	M2	R\$ 832,24	1,00		1,00	1,00	832,24	0,00	832,24	832,24
2.7.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	M2	R\$ 144,25	5,00		5,00	5,00	721,25	0,00	721,25	721,25
2.7.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 51,75	1,00		1,00	1,00	51,75	0,00	51,75	51,75
2.7.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 105,53	1,00		1,00	1,00	105,53	0,00	105,53	105,53
2.7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 5,97	6,00		6,00	6,00	35,82	0,00	35,82	35,82

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626
685479
2025.09.09
23:17:28-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Maria Aparecida
Engenheira
CREA-PE 056/2
RNO 121466



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 12,04	3,00		3,00	3,00	36,12	0,00	36,12	36,12
2.7.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 440,30	2,00		2,00	2,00	880,60	0,00	880,60	880,60
2.7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 276,63	2,00		2,00	2,00	553,26	0,00	553,26	553,26
2.7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES	UN	R\$ 25,04	1,00		1,00	1,00	25,04	0,00	25,04	25,04
2.7.10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO										
2.7.11	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	R\$ 167,67	2,00		2,00	2,00	335,34	0,00	335,34	335,34
2.7.12	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	R\$ 185,70	1,00		1,00	1,00	185,70	0,00	185,70	185,70
2.7.13	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR	UN	R\$ 140,86	2,00		2,00	2,00	281,72	0,00	281,72	281,72
2.7.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$ 33,30	10,00		10,00	10,00	333,00	0,00	333,00	333,00
2.7.15	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 171,70	1,00		1,00	1,00	171,70	0,00	171,70	171,70
2.8	REVESTIMENTO PAREDES										

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162679
2025.09.09
23:17:28-03'00'

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

0887/0001-60 01 9854-4071 01 9850-0155 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Ernildo Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Íria Aparecida de
Engenharia Civil
CPF: 056502
RN: 421364768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,56	206,21		346,14	346,14	940,32	0,00	1.578,40	1.578,40
2.8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 39,78	145,27		252,80	252,80	5.778,88	0,00	10.056,38	10.056,38
2.8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 38,61	57,42		85,29	85,29	2.216,99	0,00	3.293,05	3.293,05
2.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 62,98	57,42		85,29	85,29	3.616,31	0,00	5.371,56	5.371,56
2.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,69	145,27		252,80	252,80	681,32	0,00	1.185,63	1.185,63
2.8.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,01	145,27		145,27	145,27	1.454,15	0,00	1.454,15	1.454,15
2.9	REVESTIMENTO DE PISO										
2.9.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 42,38	49,18		49,18	49,18	2.084,25	0,00	2.084,25	2.084,25
2.9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 34,22	49,18		49,18	49,18	1.682,94	0,00	1.682,94	1.682,94

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162679
685479
2025.09.09
23:17:28-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

11 33814-4071
11 3350-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Ernildo Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Maria Aparecida
Engenheira CREA-PE 056502
782.1813464768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 59,54	49,18		46,11	46,11	2.928,18	0,00	2.745,39	2.745,39
2.10	REVESTIMENTO DE TETO										
2.10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 50,14	45,66		45,66	45,66	2.289,39	0,00	2.289,39	2.289,39
2.10.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 5,60	45,66		45,66	45,66	255,70	0,00	255,70	255,70
2.10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 12,23	45,66		45,66	45,66	558,42	0,00	558,42	558,42
2.11	PORTAS E ESQUADRIAS										
2.11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UN	R\$ 878,22	1,00		1,00	1,00	878,22	0,00	878,22	878,22
2.11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UN	R\$ 918,61	1,00		0,00	0,00	918,61	0,00	0,00	0,00
2.11.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 989,55	1,00		0,00	0,00	989,55	0,00	0,00	0,00
2.11.4	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	R\$ 8,44	15,10		11,20	11,20	127,44	0,00	94,53	94,53

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 1162679
685479
2025.09.09
23:17:28-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 083.825.254-77
Portaria Nº: 021/2024



CNPJ 40.112.067/0001-32

Insc. Est. 15.116.476R

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emília Cavalcanti, nº 97
CPF 83.779-008 | Centro | Vertentes-PE

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Inscrição de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056502
Insc. 15.116.476R



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 08 DE SETEMBRO DE 2025.


LOCAL: SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.


OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 117/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241177139

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.11.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 634,31	3,15		1,00	1,00	1.998,08	0,00	634,31	634,31
2.11.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 230,16	4,80		5,00	5,00	1.104,77	0,00	1.150,80	1.150,80
2.11.7	ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 517,83	1,28		0,40	0,40	662,82	0,00	207,13	207,13
2.11.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	R\$ 1,85	14,27		5,88	5,88	26,40	0,00	10,88	10,88
2.11.9	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	R\$ 22,16	14,27		5,88	5,88	316,22	0,00	130,30	130,30
2.11.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,27	28,54		5,88	5,88	521,43	0,00	107,43	107,43
								85.148,46	29.534,04	53.297,62	82.831,65

Valor do Boletim: CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Registro de Segurança do Trabalho
CREA-PE-096502
R. 113.4768

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162679
2025.09.09
23:17:28-03'00'

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 02

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

LOCALIDADE: VERTENTES-PE

DATA: 08/09/2025

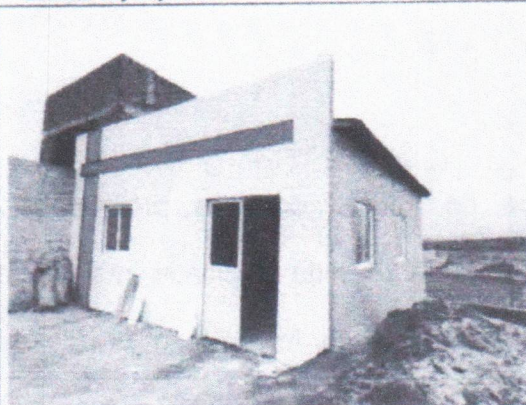


FOTO 1:

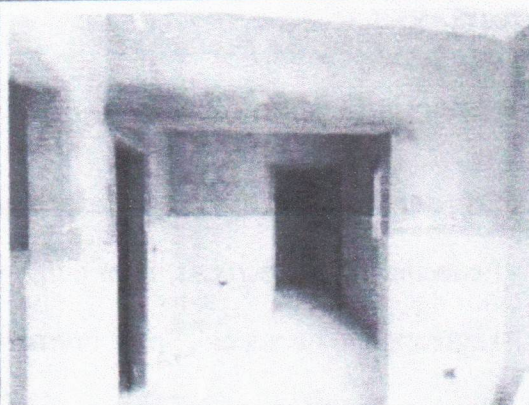


FOTO 2:

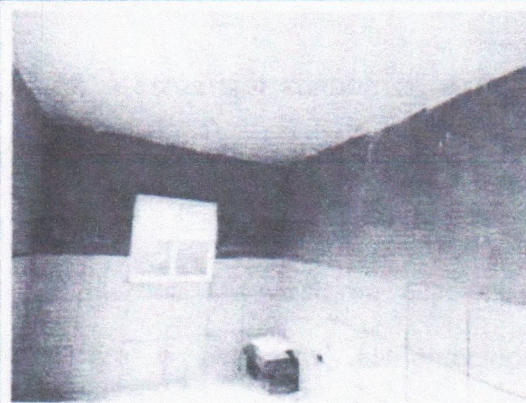


FOTO 3:

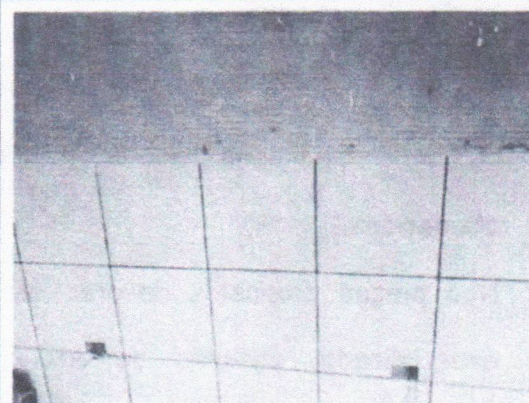


FOTO 4:

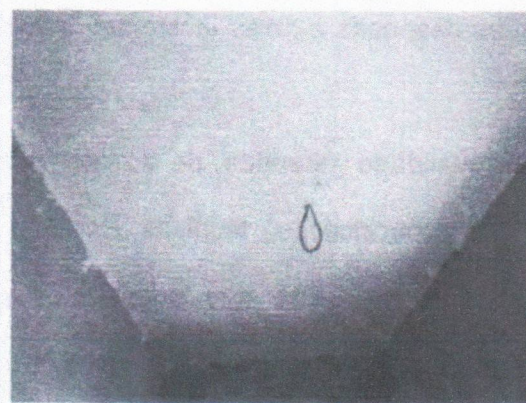


FOTO 5:

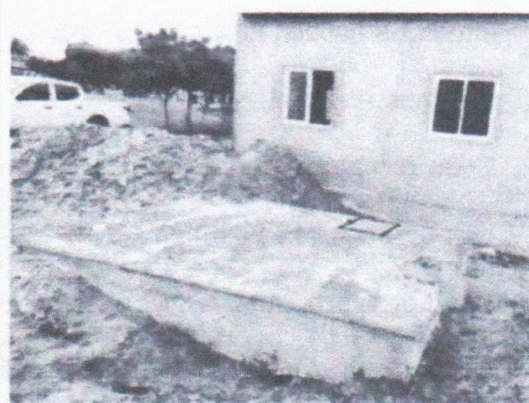



FOTO 6:


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 11626685479
2025.09.09
85479 23.1851-03007


Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056502
CN: 181361768

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 02

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE.

LOCALIDADE: VERTENTES-PE

DATA: 08/09/2025

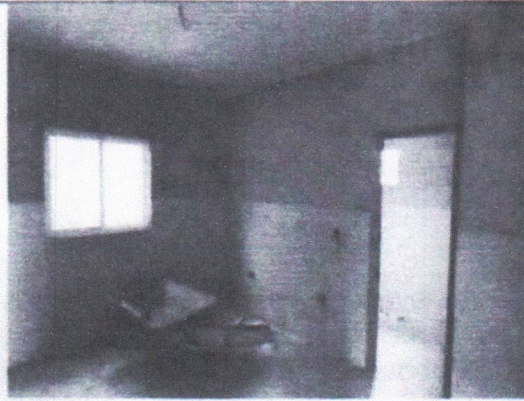


FOTO 1:

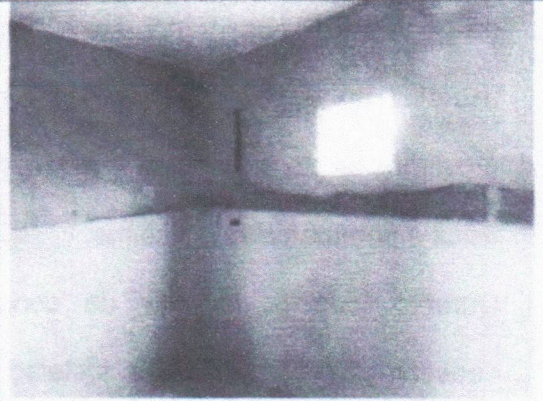


FOTO 2:

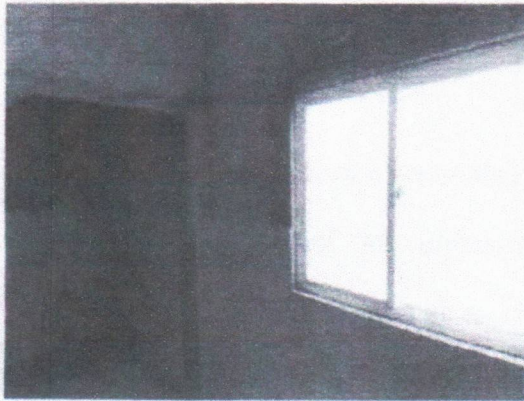


FOTO 3:

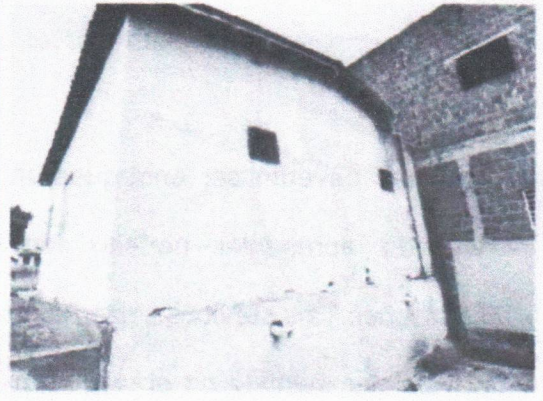



FOTO 4:


Artúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024


Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança do Trabalho
CREA/PE 056692
INSCRIÇÃO 768
