

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.


Gertúlio Timoteo Bezor
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 031/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 40

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.10.8	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	un	10,77	120,00	-	-	-	1.292,40	-	-	-
2.10.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	32,19	2,00	-	-	-	64,38	-	-	-
2.10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	43,58	1,00	-	-	-	43,58	-	-	-
2.10.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7,49	525,00	-	-	-	3.932,25	-	-	-
2.10.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	19,08	30,00	-	-	-	572,40	-	-	-
2.10.13	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM	un	822,46	21,00	-	-	-	17.271,66	-	-	-
2.10.14	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	521,72	1,00	-	-	-	521,72	-	-	-
2.10.15	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	120,67	3,00	-	-	-	362,01	-	-	-
2.11	SERVIÇOS FINAIS				-	-	-	-	-	-	-
2.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2,20	975,00	-	-	-	2.145,00	-	-	-
2.11.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM	un	614,59	1,00	-	-	-	614,59	-	-	-
3.0	VESTUÁRIO E PALCO				-	-	-	-	-	-	-
3.1	TRABALHOS EM TERRA				-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	71,70	39,48	-	-	-	2.830,72	-	-	-
3.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	43,47	13,75	-	-	-	597,72	-	-	-
3.1.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	m²	4,11	211,26	-	-	-	868,28	-	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA				-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (148) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.	m³	495,71	17,78	-	-	-	8.813,73	-	-	-

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA: 1162666-2025.09.16
 5479 23:45:54-03'00"


Maria Aparecida de Eugenia
 Engenheira Civil
 "Engenheira de Segurança"
 CREA-PE 05657
 RN: 101300479

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2.988,11	1,44	3,52		3,52	4.302,88	10.518,16	-	10.518,16
3.2.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2.870,35	4,83	2,07		2,07	13.863,80	5.941,63	-	5.941,63
3.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	78,90	83,15	106,07		106,07	6.560,54	8.368,93	-	8.368,93
3.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS.	m	33,82	9,60	-		-	324,68	-	-	-
3.3	PAREDES E REVESTIMENTOS										
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	70,61	245,74	-		-	17.351,71	-	-	-
3.3.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m²	9,87	676,64	521,24		521,24	6.578,44	5.144,64	-	5.144,64
3.3.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	6,86	160,83	-		-	1.103,30	-	-	-
3.3.4	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	37,24	63,94	135,60		135,60	2.381,13	5.049,75	-	5.049,75
3.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	36,82	407,35	304,14		304,14	14.998,63	11.198,44	-	11.198,44
3.3.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	46,33	160,83	-		-	7.451,26	-	-	-

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 1162668479
2025.09.16
5479 23:45:54-03'00"

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 021/2024

Maria Aparecida de
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056502
RN 151364768

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 40

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	90,44	63,94	60,30		60,30	5.782,74	5.453,54	-	5.453,54
3.4	PISOS										
3.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	28,21	158,65	-			4.475,52		-	
3.4.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	m²	40,74	158,65	-			6.463,41		-	
3.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	51,82	73,53	-			3.810,33		-	
3.4.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO.	Und.	530,84	2,00	-			1.061,68		-	
3.5	COBERTA										
3.5.1	LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m²	172,06	174,60	-			30.041,68		-	
3.5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	18,47	108,85	-			2.010,46		-	
3.5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	16,73	108,85	-			1.821,07		-	
3.5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	59,52	108,85	-			6.478,76		-	
3.5.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	m	73,57	15,55	-			1.144,02		-	
3.5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	m	108,38	12,60	-			1.365,59		-	
3.6	ESQUADRIAS										

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 11626602025.09.16
5479 23:45:54-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Cartaria Nº: 02112024

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança do Trabalho
CRA-PE 056502
RN: 1213604768

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	815,34	10,00	-	-	-	8.153,40	-	-	-
3.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	920,58	4,00	-	-	-	3.682,32	-	-	-
3.6.3	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	m²	877,55	1,89	-	-	-	1.658,57	-	-	-
3.6.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	665,74	31,94	-	-	-	21.263,74	-	-	-
3.6.5	COBOGÔ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	m	136,77	19,03	-	-	-	2.602,74	-	-	-
3.7	PINTURAS E ACABAMENTOS				-	-	-		-	-	-
3.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,51	160,83	-	-	-	2.816,14	-	-	-
3.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,58	443,61	-	-	-	6.911,45	-	-	-
3.7.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	31,58	16,47	-	-	-	520,13	-	-	-
3.7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	40,87	1,89	-	-	-	77,25	-	-	-
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	-	-		-	-	-
3.8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt	71,98	16,00	-	-	-	1.151,68	-	-	-
3.8.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	104,52	6,00	-	-	-	627,12	-	-	-
3.8.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	95,96	6,00	-	-	-	575,76	-	-	-

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 11626685479
2025.09.16
23:45:54-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.294-77
Portaria Nº: 071/2024

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 056592
RNº 1513664768

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.8.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pl	93,33	6,00	-	-	-	559,98	-	-	-
3.9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO										
3.9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	367,17	6,00	-	-	-	2.203,02	-	-	-
3.9.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	46,09	6,00	-	-	-	276,54	-	-	-
3.9.3	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	un	408,12	6,00	-	-	-	2.448,72	-	-	-
3.9.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	224,87	6,00	-	-	-	1.349,22	-	-	-
3.9.5	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	m²	684,92	2,36	-	-	-	1.616,42	-	-	-
3.9.6	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	un	80,97	4,00	-	-	-	323,88	-	-	-
3.9.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	124,90	6,00	-	-	-	749,40	-	-	-
3.9.8	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	51,80	2,00	-	-	-	103,60	-	-	-
3.9.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	60,98	2,00	-	-	-	121,96	-	-	-
3.9.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	76,68	6,00	-	-	-	460,08	-	-	-
3.9.11	SARONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	68,30	6,00	-	-	-	409,80	-	-	-
3.9.12	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	90,30	4,00	-	-	-	361,20	-	-	-
3.9.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	13,87	6,00	-	-	-	83,22	-	-	-
3.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V										

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 11626685479
2025.09.16
5479 23:45:54-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 001/2021

Maria Aparecida
Engenheira
CREA-PE 056502
AN: 1213064768

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	pt	209,48	16,00	-	-	-	3.351,68	-	-	-
3.10.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	pt	199,03	6,00	-	-	-	1.194,18	-	-	-
3.10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	542,37	1,00	-	-	-	542,37	-	-	-
3.10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,26	4,00	-	-	-	53,04	-	-	-
3.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	32,19	10,00	-	-	-	321,90	-	-	-
3.10.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	123,61	12,00	-	-	-	1.483,32	-	-	-
3.10.7	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	521,72	1,00	-	-	-	521,72	-	-	-
3.10.8	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	120,67	3,00	-	-	-	362,01	-	-	-
3.11	SERVIÇOS FINAIS				-	-	-	-	-	-	-
3.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2,20	174,60	-	-	-	384,12	-	-	-
3.11.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM	un	614,59	1,00	-	-	-	614,59	-	-	-
4.0	AUDITÓRIO				-	-	-	-	-	-	-
4.1	TRABALHOS EM TERRA				-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	71,70	39,48	-	-	-	2.830,72	-	-	-
4.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	43,47	13,75	-	-	-	597,72	-	-	-
4.1.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	m²	4,11	211,26	-	-	-	868,28	-	-	-
4.2	INFRAESTRUTURA				-	-	-	-	-	-	-

GUSTAVO DE ARAUJO
GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626682025.09.16
5479 23:45:54-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezer
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Maria Aparecida
Engenheira C
Engenheira de Segurança
CREA-PE 086592
RNP 1513054768

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.2.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m³	495,71	17,78	-	-	-	8.813,73	-	-	-
4.2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2.988,11	1,44	1,63	-	1,63	4.302,88	4.870,62	-	4.870,62
4.2.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	2.870,35	4,83	-	-	-	13.863,80	-	-	-
4.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	78,90	83,15	157,58	-	157,58	6.560,54	12.433,07	-	12.433,07
4.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	59,57	9,60	-	-	-	571,88	-	-	-
4.2.6	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	m³	479,35	37,00	-	-	-	15.339,20	-	-	-
4.3	PAREDES E REVESTIMENTOS				-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	70,61	312,06	-	-	-	22.034,56	-	-	-
4.3.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m²	9,87	524,36	-	-	-	5.175,44	-	-	-
4.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	36,82	451,56	-	-	-	16.626,44	-	-	-
4.4	PISOS				-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	28,21	158,45	-	-	-	4.469,88	-	-	-
4.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	44,76	158,45	-	-	-	7.092,23	-	-	-
4.4.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	79,23	158,45	-	-	-	12.554,00	-	-	-

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162668
5479

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626685479
2025.09.16
23:45:54-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 09/2022

Maria Aparecida
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança
CREA-PE 058592
RN: 101364768

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 40

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.5	COBERTA										
4.5.1	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m²	172,06	174,54				30.031,36			
4.5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	37,92	166,14				6.300,03			
4.5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	18,47	166,14				3.068,61			
4.5.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16,73	166,14				2.779,53			
4.5.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	59,52	166,00				9.880,32			
4.5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	m	73,57	20,00				1.471,40			
4.5.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	108,38	16,00	169,00		169,00	1.734,08	18.316,22		18.316,22
4.6	ESQUADRIAS										
4.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	861,47	1,00				861,47			
4.6.2	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	un	932,90	8,00				7.463,20			
4.6.3	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	un	233,75	8,00				1.870,00			
4.6.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	477,94	12,76				6.098,52			
4.6.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	324,40	10,00				3.244,00			

GUSTAVO GUSTAVO DE
DE ARAUJO ARAUJO
LIMA:11626682025.09.16
5479 23:45:54-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2022

Martha Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Instituto de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056602
RN: 1511854768

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.6.6	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	m	107,23	5,24	-	-	-	561,89	-	-	-
4.7	PINTURAS E ACABAMENTOS										
4.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,51	408,06	-	-	-	7.145,14	-	-	-
4.7.2	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES	un	145,27	6,00	-	-	-	871,62	-	-	-
4.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V										
4.8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	pt	209,48	41,00	-	-	-	8.588,68	-	-	-
4.8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	pt	199,03	16,00	-	-	-	3.184,48	-	-	-
4.8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE FMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	542,37	1,00	-	-	-	542,37	-	-	-
4.8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 3DA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,26	2,00	-	-	-	26,52	-	-	-
4.8.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	111,50	41,00	-	-	-	4.571,50	-	-	-
4.8.6	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	pt	349,14	9,00	-	-	-	3.142,26	-	-	-
4.8.7	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	120,67	11,00	-	-	-	1.327,37	-	-	-
4.9	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO										
4.9.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	pt	292,61	5,00	-	-	-	1.463,05	-	-	-
4.9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	pt	198,46	5,00	-	-	-	992,30	-	-	-

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 1162668-5479
2025.09.16
23:45:54-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Maria Aparecida
Engenheira Civil
Registro de Segurança de
CREA-PE 056502
AN: 181346768

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 40

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE


PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

DATA 03/01/2022.

VERTENTES, 12 DE SETEMBRO DE 2025.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.10	SERVIÇOS FINAIS										
4.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2,20	157,20	-	-	-	345,84	-	-	-
4.11.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM	un	614,59	1,00	-	-	-	614,59	-	-	-
								3.724.009,11	3.042.992,04	53.171,82	3.096.163,86

Valor do Boletim: CINQUENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS


 Maria Aparecida de Lima
 Engenheira Civil
 Conselho de Segurança do Trabalho
 CREA-PE 056502
 AN: 19.12.674.768


 Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria DP: 021/2022


GUSTAVO DE ARAUJO
 GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA: 11626685479
 LIMA: 11626685479
 2025.09.16
 5479 23:45:54-03'00"



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 40


PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

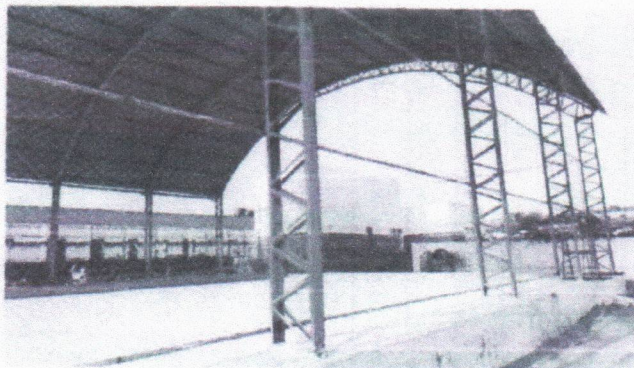


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO
GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 11626 9
685479
2025 09 16
23:49:56-03007


Maria Aparecida de Lencastre
Engenheira Civil
CREA-PE 05654
RNP 1813156768

 CNPJ
10.296.887/0001-60

 81 99814-4011
81 9500-0189

 gabinete@vertentes.pe.gov.br

 Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE
