



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: RCL CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES, CNPJ: 37.658.554/0001-90


LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.

VERTENTES, 03 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 106/2025 PROCESSO Nº 023/2025 - DISPENSA Nº 023/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO										
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	138,48	-	76,80	76,80	13.787,07	-	7.646,21	7.646,21
1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	131,28	-	72,00	72,00	1.316,74	-	722,16	722,16
1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	547,00	-	300,00	300,00	50.072,38	-	27.462,00	27.462,00
1.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	15,00	-	10,00	10,00	7.605,45	-	5.070,30	5.070,30
2.0	AVENIDA SERGIO GERRA										
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	29,52	-	29,52	29,52	2.939,01	-	2.939,01	2.939,01
2.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	27,60	-	27,60	27,60	276,83	-	276,83	276,83
2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	115,00	-	115,00	115,00	10.527,10	-	10.527,10	10.527,10
2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	4,00	-	4,00	4,00	2.028,12	-	2.028,12	2.028,12
3.0	RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE										
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	13,92	-	13,92	13,92	1.385,88	-	1.385,88	1.385,88
3.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	11,04	-	11,04	11,04	110,73	-	110,73	110,73
3.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	46,00	-	46,00	46,00	4.210,84	-	4.210,84	4.210,84
3.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	6,00	-	6,00	6,00	3.042,18	-	3.042,18	3.042,18



Gerônimo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

01 99814-4011
01 9505-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CIP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE - 181907982-1

PEDRO MANOEL
REZENDE DE
LIMA:08037885410

Assinado de forma digital por
PEDRO MANOEL REZENDE DE
LIMA:08037885410
Dados: 2025.06.03 14:08:09
-03'00"

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: RCL CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES, CNPJ: 37.658.554/0001-90

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.


VERTENTES, 03 DE JUNHO DE 2025

CONTRATO Nº 106/2025 PROCESSO Nº 023/2025 - DISPENSA Nº 023/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.0	TRAVESSA DA RUA MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAUJO										
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	12,48	-	12,48	12,48	1.242,51	-	1.242,51	1.242,51
4.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	10,56	-	10,56	10,56	105,92	-	105,92	105,92
4.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	44,00	-	44,00	44,00	4.027,76	-	4.027,76	4.027,76
4.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	4,00	-	4,00	4,00	2.028,12	-	2.028,12	2.028,12
5.0	SERRA DA CACHOEIRA										
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	29,76	-	24,00	24,00	2.962,91	-	2.389,44	2.389,44
5.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	26,88	-	21,60	21,60	269,61	-	216,65	216,65
5.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	112,00	-	90,00	90,00	10.252,48	-	8.238,60	8.238,60
5.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	6,00	-	5,00	5,00	3.042,18	-	2.535,15	2.535,15

								121.233,82	-	86.205,51	86.205,51
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	-----------	-----------

Valor do Boletim: OITENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS



Gerônimo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

01 99214-4011
01 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Ernildo Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 [Centro] Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

PEDRO MANOEL
REZENDE DE
LIMA:08037885
410

Assinado de forma
digital por PEDRO
MANOEL REZENDE DE
LIMA:08037885410
Dados: 2025.06.03
14:08:19 -03'00"

5.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M					
			90,00				90,00
5.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND				TOTAL:	90,00
						5,00	5,00
						TOTAL:	5,00

PEDRO MANOEL
 REZENDE DE
 LIMA:08037885410

Assinado de forma digital por
 PEDRO MANOEL REZENDE DE
 LIMA:08037885410
 Dados: 2025.06.03 14:09:16
 -03'00'


Gerônimo Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

2.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3					
			115,00	0,40	0,60		27,60
						TOTAL:	27,60
2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M					
			115,00				115,00
						TOTAL:	115,00
2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND					
						4,00	4,00
						TOTAL:	4,00
3.0	RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					
			46,00	0,40	0,60		11,04
			1,00	0,60	0,80	6,00	2,88
						TOTAL:	13,92
3.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3					
			46,00	0,40	0,60		11,04
						TOTAL:	11,04
3.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M					
			46,00				46,00
						TOTAL:	46,00
3.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND					
						6,00	6,00
						TOTAL:	6,00

Gertúlio Limoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria N°. 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

PEDRO MANOEL
REZENDE DE
LIMA:080378854
 10

Assinado de forma digital por PEDRO MANOEL REZENDE DE LIMA:08037885410
 Dados: 2025.06.03 14:08:49 -03'00'

**MEMORIA DE CALCULO****BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 106/2025 PROCESSO Nº 023/2025 - DISPENSA Nº 023/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

VERTENTES, 03 DE JUNHO DE 2025


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					
			300,00	0,40	0,60		72,00
			1,00	0,60	0,80	10,00	4,80
						TOTAL:	76,80
1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3					
			300,00	0,40	0,60		72,00
						TOTAL:	72,00
1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M					
			300,00				300,00
						TOTAL:	300,00
1.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND					
						10,00	10,00
						TOTAL:	10,00
2.0	AVENIDA SERGIO GERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					
			115,00	0,40	0,60		27,60
			1,00	0,60	0,80	4,00	1,92
						TOTAL:	29,52


Gertulio Fátima Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil

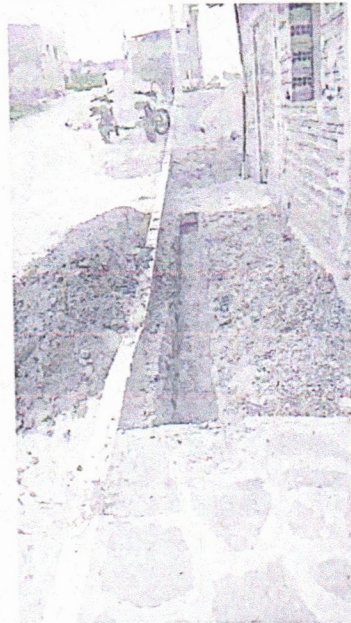
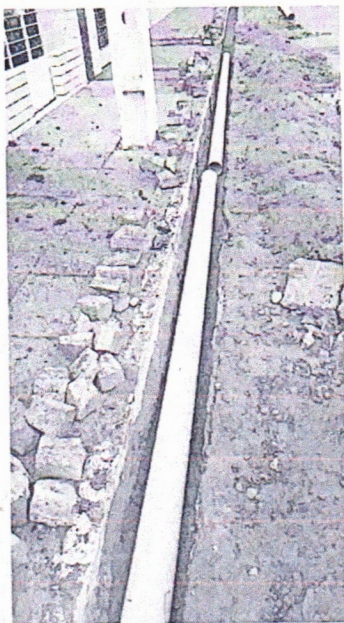
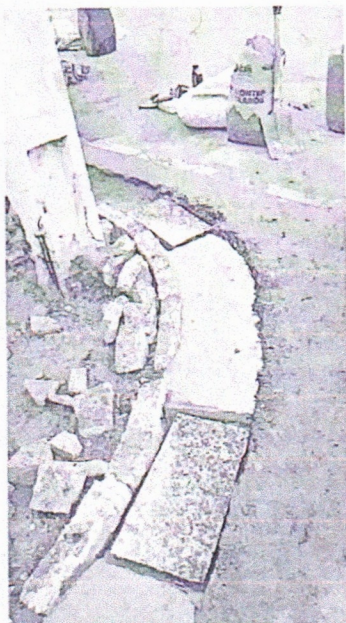
CREA PE 181907982-1
Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

**PEDRO MANOEL
REZENDE DE
LIMA:08037885410**

Assinado de forma digital por
PEDRO MANOEL REZENDE
DE LIMA:08037885410
Dados: 2025.06.03 14:08:38
+03'00'

CONTRATO Nº 106/2025 PROCESSO Nº 023/2025 - DISPENSA Nº 023/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.



Bruno
Bruno Alberto Miranda da Silva

Bruno Alberto Miranda da Silva

CPF: 101.567.264-75

Secretário de Saneamento e Meio Ambiente

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emidio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1
