

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: RCL CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES, CNPJ: 37.658.554/0001-90
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

VERTENTES, 01 DE JULHO DE 2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.

CONTRATO N° 106/2025 PROCESSO N° 023/2025 - DISPENSA N° 023/2025 / ART DE EXECUÇÃO N°

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	LOTEAMENTO SANTO ANTONIO										
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	138,48	76,80	52,75	129,55	13.787,07	7.646,21	5.251,79	12.898,00
1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	131,28	72,00	52,75	124,75	1.316,74	722,16	529,08	1.251,24
1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	547,00	300,00	219,80	519,80	50.072,38	27.462,00	20.120,49	47.582,49
1.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	15,00	10,00	18,00	28,00	7.605,45	5.070,30	9.126,54	14.196,84
2.0	AVENIDA SERGIO GERRA										
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	29,52	29,52	-	29,52	2.939,01	2.939,01	-	2.939,01
2.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	27,60	27,60	-	27,60	276,83	276,83	-	276,83
2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	115,00	115,00	-	115,00	10.527,10	10.527,10	-	10.527,10
2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	4,00	4,00	-	4,00	2.028,12	2.028,12	-	2.028,12
3.0	RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE										
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	13,92	13,92	-	13,92	1.385,88	1.385,88	-	1.385,88
3.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	11,04	11,04	-	11,04	110,73	110,73	-	110,73
3.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	46,00	46,00	-	46,00	4.210,84	4.210,84	-	4.210,84
3.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	6,00	6,00	-	6,00	3.042,18	3.042,18	-	3.042,18

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: RCL CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES, CNPJ: 37.658.554/0001-90
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

VERTENTES, 01 DE JULHO DE 2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.

CONTRATO Nº 106/2025 PROCESSO Nº 023/2025 - DISPENSA Nº 023/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
4.0	TRAVESSA DA RUA MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAUJO												
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	12,48	12,48	-	12,48	1.242,51	1.242,51	-	-	1.242,51	
4.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	10,56	10,56	-	10,56	105,92	105,92	-	-	105,92	
4.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	44,00	44,00	-	44,00	4.027,76	4.027,76	-	-	4.027,76	
4.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	4,00	4,00	-	4,00	2.028,12	2.028,12	-	-	2.028,12	
5.0	SERRA DA CACHOEIRA												
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	99,56	29,76	24,00	-	24,00	2.962,91	2.389,44	-	-	2.389,44	
5.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,03	26,88	21,60	-	21,60	269,61	216,65	-	-	216,65	
5.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	91,54	112,00	90,00	-	90,00	10.252,48	8.238,60	-	-	8.238,60	
5.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	507,03	6,00	5,00	-	5,00	3.042,18	2.535,15	-	-	2.535,15	

								121.233,82	86.205,51	35.027,90	121.233,41
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------

Valor do Boletim: TRINTA E CINCO MIL E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PEDRO MANOEL REZENDE DE LIMA:08037885
 410

Assinado de forma digital por PEDRO MANOEL REZENDE DE LIMA:08037885410
 Dados: 2025.07.01 08:28:11 -03'00'

MEMORIA DE CALCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 106/2025 PROCESSO Nº 023/2025 - DISPENSA Nº 023/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

VERTENTES, 01 DE JULHO DE 2025


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					
	LOTEAMENTO SANTO ANTONIO		183,80	0,40	0,60		44,11
	LAGOA RASA (A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO)		36,00	0,40	0,60		8,64
						TOTAL:	52,75
1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3					
	LOTEAMENTO SANTO ANTONIO		183,80	0,40	0,60		44,11
	LAGOA RASA (A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO)		36,00	0,40	0,60		8,64
						TOTAL:	52,75
1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M					
	LOTEAMENTO SANTO ANTONIO		183,80				183,80
	LAGOA RASA (A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO)		36,00				36,00
						TOTAL:	219,80
1.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND					
						14,00	14,00
						4,00	4,00
						TOTAL:	18,00

PEDRO MANOEL REZENDE DE LIMA:08037885410
 Assinado de forma digital por PEDRO MANOEL REZENDE DE LIMA:08037885410
 Dados: 2025.07.01 08:28:56 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONTRATO N° 106/2025 PROCESSO N° 023/2025 - DISPENSA N° 023/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE.

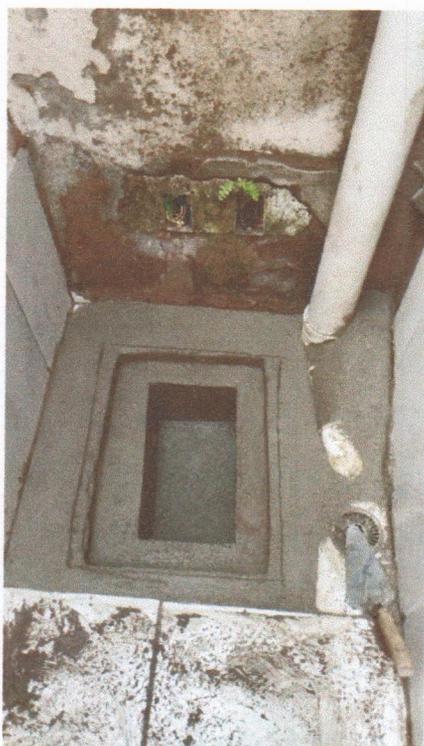

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024
