



MEMORIA DE CALCULO			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01				
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.							
CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº							
VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
2.0	MARIA ENEDINA						
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					
	SALA M		5,00		0,80		4,00
						TOTAL:	4,00
2.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					
	COZINHA		2,70	2,30			6,21
	ALMOXARIFADO		7,00	4,70			32,90
	DESPENSA		3,80	2,70			10,26
						TOTAL:	49,37
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					
	COZINHA		1,20	0,50			0,60
						TOTAL:	0,60
2.2	PAREDES E PAINEIS						
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM. [ESPESSURA 7CM]. AF_05/2020	M2					
			8,70		3,50		30,45
						TOTAL:	30,45

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

01 99814-4011
01 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Engenheiro Civil
Gustavo de Araújo Lima
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida
Engenheira Civil
CREA-PE 064502
RNP 181366268

2.3	REVESTIMENTOS PAREDES						
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2					
	SALA M		3,20		3,50		11,20
	AUDITÓRIO		2,00		0,50		1,00
	SALA 02		2,00		1,00		2,00
						TOTAL:	14,20
2.3.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2					
	SALA M		3,20		3,50		11,20
	AUDITÓRIO		2,00		0,50		1,00
	SALA 02		2,00		1,00		2,00
						TOTAL:	14,20
2.4	REVESTIMENTOS PISO						
2.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AFD2/2023, PE	M2					
	COZINHA		0,50	1,20			0,60
						TOTAL:	0,60
2.5	REVESTIMENTO TETO						
2.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023, PS	M2					
	COZINHA		2,70	2,30			6,21
	ALMOXARIFADO		7,00	4,70			32,90
	DESPENSA		3,80	2,70			10,26
						TOTAL:	49,37
2.6	REVESTIMENTO TETO						
2.6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	M2					
	COZINHA		0,50	1,20	1,00		0,60
						TOTAL:	0,60

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emidio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Instituto de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056592
PNE-ENR-0047204

2.7	PINTURA					
2.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2				
	COZINHA	2.70	0.90	2.00	4.86	
	COZINHA	2.30	0.90	2.00	4.14	
	ALMOXARIFADO	7.00	2.60	2.00	36.40	
	ALMOXARIFADO	4.70	2.60	2.00	24.44	
	BIBLIOTECA	4.50	3.10	2.00	27.90	
	BIBLIOTECA	4.75	3.10	2.00	29.45	
	DESCONTO PORTAS BIBLIOTECA	(0.80)	2.10		(1.68)	
	DESCONTO JANELAS BIBLIOTECA	(2.00)	1.00		(2.00)	
	DESPENSA	2.70	0.90	2.00	4.86	
	DESPENSA	3.80	0.90	2.00	6.84	
	DESCONTO PORTAS DESPENSA	(0.80)	2.10		(1.68)	
	DIRETORIA	2.70	0.88	2.00	4.75	
	DIRETORIA	3.80	0.88	2.00	6.69	
	DESCONTO PORTA DIRETORIA	(0.80)	2.10		(1.68)	
	AUDITÓRIO	8.75	4.15	2.00	72.63	
	AUDITÓRIO	16.70	4.15	2.00	138.61	
	DESCONTO BASCULANTE AUDITÓRIO	(1.00)	1.40	3.00	(4.20)	
	DESCONTO PORTA AUDITÓRIO	(2.10)	1.15	2.00	(4.83)	
	DESCONTO BASCULANTE AUDITÓRIO	(2.40)	1.20	2.00	(5.76)	
	SECRETARIA	6.40	3.65	2.00	46.72	
	SECRETARIA	7.60	3.65	2.00	55.48	
	DESCONTO PORTA SECRETARIA	(1.00)	2.10		(2.10)	
	DESCONTO JANELA SECRETARIA	(1.40)	1.10		(1.54)	
	SALA 02	6.43	4.35	2.00	55.94	
	SALA 02	9.40	4.35	2.00	81.78	
	DESCONTO PORTA SALA 02	(1.00)	2.10		(2.10)	

Gertúlio Tinoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 056502
CPF: 1813686768

	DESCONTO BASCULANTE SALA 02		(2.40)	1.20	2.00	(5.76)
	CORREDOR 02		9.68	4.20	2.00	81.31
	CORREDOR 01		8.50	4.50	2.00	76.50
	SALA 01		12.03	4.40	2.00	105.86
	DESCONTO PORTA SALA 01		(1.00)	2.10		(2.10)
	SALA 03		13.36	4.40	2.00	117.57
	DESCONTO PORTA SALA 03		(1.00)	2.10		(2.10)
	DESCONTO BASCULANTE SALA 03		(2.40)	1.20	2.00	(5.76)
	SALA 05		14.47	4.25	2.00	123.00
	DESCONTO PORTA SALA 05		(1.00)	2.10		(2.10)
	DESCONTO PORTA SALA 03		(1.00)	2.10		(2.10)
	SALA 04		14.65	4.25	2.00	124.53
					TOTAL:	1.182.76
2.7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2				
	BASCULANTE AUDITÓRIO		1.40	1.00	0.30	0.42
	BASCULANTE AUDITÓRIO		2.40	1.20	0.30	0.86
	BASCULANTE SECRETARIA		1.40	1.10	0.30	0.46
	BASCULANTE SECRETARIA		2.40	1.20	0.60	1.73
					TOTAL:	3.47
2.7.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2				
	COZINHA		0.75	2.10	2.00	3.15
	BIBLIOTECA		0.80	2.10	2.00	3.36
	DESPENSA		0.80	2.10	2.00	3.36
	PORTA AUDITÓRIO		1.15	2.10	2.00	4.83
	PORTA SECRETARIA		1.00	2.10	2.00	4.20
	PORTA SALA 02		1.00	2.10	2.00	4.20
	PORTA SALA 01		1.00	2.10	2.00	4.20


Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°. 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, n° 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE



Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Conselho de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056502
RNT 181366768

	PORTA SALA 03		1,00		2,10	2,00	4,20
						TOTAL:	31,50
2.8	PORTAS E ESQUADRIAS						
2.8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND					
	BIBLIOTECA					1,00	1,00
	DESPENSA					1,00	1,00
						TOTAL:	2,00
2.8.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2					
	AUDITÓRIO		1,40		1,00		1,40
	SALA 03		2,40		1,20	2,00	5,76
						TOTAL:	7,16
2.10	TELHADO						
2.10.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF. 07/2019	M2					
	SECRETARIA		4,60	7,60			34,96
			7,00	7,00		2,00	98,00
			14,20	29,00			411,80
			12,50	20,00			250,00
						TOTAL:	794,76
2.10.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M					
			8,20				8,20
						TOTAL:	8,20
2.10.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2					
			16,70	8,75			146,13



Gerônimo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


 CNPJ
 10.296.887/0001-60


 81 99814-4011
 81 9500-0189


 gabinete@vertentes.pe.gov.br



 Dr. Emídio Cavalcanti, nº 87
 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1


Maria Aparecida de Lima
 Engenheira Civil
 Conselho de Segurança do Trabalho
 CREA-PE 056502
 RNP 1817666768




						TOTAL:	146,12
2.10.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					
			16,70	8,75			146,13
						TOTAL:	146,12
2.10.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2					
			16,70	8,75			146,13
						TOTAL:	146,12
2.10.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2					
			16,70	8,75			146,13
						TOTAL:	146,12


Gerulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


Maria Aparecida de Lima
 Engenheira Civil
 Engenharia de Segurança do Trabalho
 CREA-PE 036502
 (11) 4511-6666

CNPJ 10.296.887/0001-60 | 81 99814-4011 | 81 9500-0189 | gabinete@vertentes.pe.gov.br | Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 | CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	ESCOLA PADRE ROCHA - LIVRAMENTO										
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,11	6,00	-	-	-	78,66	-	-	-
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,23	10,92	-	-	-	78,95	-	-	-
1.1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	14,44	5,00	-	-	-	72,20	-	-	-
1.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	10,94	4,00	-	-	-	43,76	-	-	-
1.1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	2,06	9,00	-	-	-	18,54	-	-	-
1.2	REVESTIMENTOS EM PAREDES										
1.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,93	6,00	-	-	-	29,58	-	-	-
1.2.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	44,79	6,00	-	-	-	268,74	-	-	-
1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	69,27	15,24	-	-	-	1.055,67	-	-	-
1.3	REVESTIMENTOS EM TETO										
1.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	51,00	42,00	-	-	-	2.142,00	-	-	-
1.4	PINTURA										

Gertuino Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 40.112.067/0001-32 III 99814-4011 01 9500-0105 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Ercilio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 (Centro) Vertentes-PE

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança do Trabalho
CREA-PE 036502
RNP 1813666768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	11,44	1.759,03	-	-	-	20.123,30	-	-	-
1.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,05	225,67	-	-	-	3.170,66	-	-	-
1.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	29,71	4,11	-	-	-	122,11	-	-	-
1.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	10,05	29,63	-	-	-	297,78	-	-	-
1.5	PORTAS E ESQUADRIAS										
1.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	111,81	11,00	-	-	-	1.229,91	-	-	-
1.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	347,63	1,00	-	-	-	347,63	-	-	-
1.5.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	354,61	1,00	-	-	-	354,61	-	-	-
1.5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	375,71	2,00	-	-	-	751,42	-	-	-
1.5.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	855,46	1,47	-	-	-	1.257,53	-	-	-
1.6	LOUÇAS SANITÁRIAS										
1.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	566,19	3,00	-	-	-	1.698,57	-	-	-

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.897/0001-80

81 99814-4011
81 3500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 87
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Registada de Lima
Engenheiro Civil
Segurança do Trabalho
COT 4.19 056502
CPF 1813666768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS VERTENTES-PE.

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.6.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UND	636,61	2,00	-	-	-	1.273,22	-	-	-
1.6.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UND	447,44	1,00	-	-	-	447,44	-	-	-
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024	UND	37,38	19,00	-	-	-	710,41	-	-	-
2.0	MARIA ENEDINA										
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	65,30	4,00	-	4,00	4,00	261,20	-	261,20	261,20
2.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	2,11	49,37	-	49,37	49,37	104,17	-	104,17	104,17
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	86,49	0,60	-	0,60	0,60	51,89	-	51,89	51,89

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança
CREA-PE 056502
RNE 1813668768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2	PAREDES E PAINEIS										
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM) AF_05/2020	M2	67,13	30,45	-	30,45	30,45	2.044,11	-	2.044,11	2.044,11
2.3	REVESTIMENTOS PAREDES										
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M2	4,93	14,20	-	14,20	14,20	70,01	-	70,01	70,01
2.3.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	M2	44,79	14,20	-	14,20	14,20	636,02	-	636,02	636,02
2.4	REVESTIMENTOS PISO										
2.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF02/2023_PE	M2	71,54	0,60	-	0,60	0,60	42,92	-	42,92	42,92
2.5	REVESTIMENTO TETO										
2.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	M2	70,60	49,37	-	49,37	49,37	3.485,52	-	3.485,52	3.485,52
2.6	REVESTIMENTO TETO										
2.6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020	M2	222,75	0,60	-	0,60	0,60	133,65	-	133,65	133,65
2.7	PINTURA										
2.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	11,44	1.182,76	-	1.182,76	1.182,76	13.530,77	-	13.530,77	13.530,77

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 10.296.887/0001-60 81 35814-4011 81 3500-0103 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Ernildo Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centre | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança da Informação
CREA-PE 056502
CPF 1813686768



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
273	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	29,71	3,47	-	3,47	3,47	103,09	-	103,09	103,09
274	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	10,05	31,50	-	31,50	31,50	316,58	-	316,58	316,58

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056582
RNP 1513666768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.8	PORTAS E ESQUADRIAS										
2.8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	375,71	2,00	-	2,00	2,00	751,42	-	751,42	751,42
2.8.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (8,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	842,83	7,16	-	7,16	7,16	6.034,66	-	6.034,66	6.034,66
2.10	TELHADO										
2.10.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,36	794,76	-	794,76	794,76	17.770,83	-	17.770,83	17.770,83
2.10.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,30	8,20	-	8,20	8,20	535,46	-	535,46	535,46
2.10.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,05	146,12	-	146,12	146,12	591,79	-	591,79	591,79
2.10.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	43,55	146,12	-	146,12	146,12	6.363,53	-	6.363,53	6.363,53
2.10.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,80	146,12	-	146,12	146,12	4.208,26	-	4.208,26	4.208,26
2.10.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	63,66	146,12	-	146,12	146,12	9.302,00	-	9.302,00	9.302,00

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.710-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CPF Nº 181907982-1

Maria Aparecida de
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA PE 056502
RST 1413641-768



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.0	CRECHE ALICE SANTOS										
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
3.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UND	10,94	1,00	-	-	-	10,94	-	-	-
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M3	118,61	0,02	-	-	-	2,37	-	-	-
3.2	PAREDES E PAINEIS										
3.2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1.2.8)	M2	73,62	2,42	-	-	-	178,16	-	-	-
3.3	REVESTIMENTOS EM PAREDES										

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 086.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida de
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança
CREA-PE 056592
RNE 1813667749



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,93	4,84	-	-	-	23,86	-	-	-
3.3.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	44,79	4,84	-	-	-	216,78	-	-	-
3.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	69,27	4,67	-	-	-	323,49	-	-	-
3.4	ESTRUTURAS										
3.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	222,75	2,25	-	-	-	501,19	-	-	-
3.5	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS										
3.5.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	532,35	1,00	-	-	-	532,35	-	-	-
3.6	LASTRO										
3.6.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024	M3	252,07	24,02	-	-	-	6.054,72	-	-	-
4.0	ESCOLA CAPELA NOVA										
4.1	PAREDES E PAINEIS										

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.256.887/0001-30

01 99814-4011
01 9500-0165

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Covaicanti, nº 97
CEP 55.779-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Maria Aparecida de Lencastre
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056602
RNP 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: Lettiere Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32

VERTENTES, 07 DE JULHO DE 2025


LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.


OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	73,62	31,00	-	-	-	2.282,22	-	-	-
4.1.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	127,31	6,20	-	-	-	789,32	-	-	-
4.2	REVESTIMENTOS EM PAREDES										
4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M2	4,93	104,00	-	-	-	512,72	-	-	-
4.2.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	M2	44,79	104,00	-	-	-	4.658,16	-	-	-
4.3	ESTRUTURA										
4.3.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.314,56	0,67	-	-	-	1.550,76	-	-	-
4.4	PINTURA										
4.4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	10,86	62,00	-	-	-	673,32	-	-	-

								120.220,93	-	66.337,88	66.337,88
Valor do Boletim: SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS											


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
Engenharia de Segurança do Trabalho
CREA-PE 056502
CNPJ 18136617-00

CNPJ 40.112.067/0001-32 81 99814-4031 81 9509-0189 gabirieto@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-800 | Centro | Vertentes-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

CONTRATO Nº 152/2025 PROCESSO Nº 036/2025 - DISPENSA Nº 036/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024



CNPJ
10.296.887/0001-60



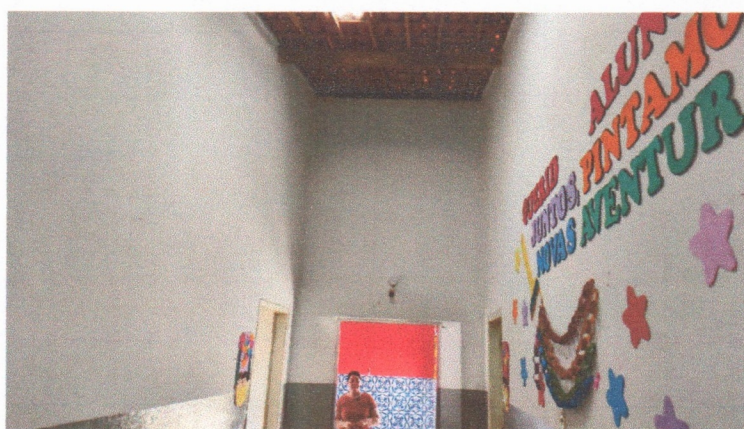
81 99814-4011
81 9500-0189



gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE




Gentilino Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria Nº: 091/2024
