

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE

DISPENSA Nº 007/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/08/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM
I	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO										
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	70,95	10,37		10,37	10,37	735,75	-	107,54	107,54
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	124,64	7,42		7,42	7,42	924,83	-	55,06	55,06
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,21	55,00		55,00	55,00	1.276,55	-	3.025,00	3.025,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	106,66	10,64		10,40	10,40	1.134,86	-	1.109,26	1.109,26
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	96,17	4,78		4,57	4,57	459,69	-	439,50	439,50
3.0	ESTRUTURA										
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.395,57	1,42		1,42	1,42	3.401,71	-	3.401,71	3.401,71
4.0	PAREDES E PAINÉIS										
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	76,29	103,42		103,42	103,42	7.889,91	-	7.889,91	7.889,91
4.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	131,93	19,04		19,04	19,04	2.511,95	-	2.511,95	2.511,95
5.0	PISOS										
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_01/2024	M3	883,46	21,50			0,00	18.994,39	-	-	0,00
5.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	109,02	430,00			0,00	46.878,60	-	-	0,00
6.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES										

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:11626
 685479
 2025.09.01
 22:43:18-03'00"

Gentile Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.983.264-97/0001-60
 Portaria Nº: 091/2024

01 99314-4271
01 9500-0155

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CPF 95.770-000 | Centro | Vertentes-PE

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
 PATRICK CESAR CIPRIANO DA
 SILVA:05842598400

Dados: 2025.08.26 12:18:06 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: VERTENTES-PE.


OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE

DISPENSA Nº 007/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/08/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,24	78,08		78,08	78,08	409,14	-	409,14	409,14
6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	47,58	78,08		78,08	78,08	3.715,05	-	3.715,05	3.715,05
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	73,33	59,24			0,00	4.344,07	-	-	0,00
7.0	TELHADO										
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	107,18	11,96		11,44	11,44	1.281,87	-	1.226,14	1.226,14
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	63,19	11,96		11,44	11,44	755,75	-	722,89	722,89
8.0	PINTURA										
8.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	12,22	847,64		337,03	337,03	10.358,16	-	4.118,51	4.118,51
8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	10,86	58,64			0,00	636,83	-	-	0,00
9.0	PORTAS E ESQUADRIAS										
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR. 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1.020,68	2,00			0,00	2.041,36	-	-	0,00

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA:11626 479
 685479
 2025.09.01
 22:43:18-03'00'


Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.989.284-77
 Portaria Nº: 097/2024

51 99814-4011
01 9806-0188

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emília Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
 PATRICK CESAR CIPRIANO DA
 SILVA:05842598400
 Dados: 2025.08.26 12:18:17
 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01**

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE


DISPENSA Nº 007/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 24/08/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1.339,65	1,00			0,00	1.339,65	-	-	0,00
10.0	LOUÇAS SANITÁRIAS										-
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	605,89	1,00			0,00	605,89	-	-	0,00
10.2	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	16,01	2,00			0,00	32,02	-	-	0,00
10.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	474,12	3,00			0,00	1.422,36	-	-	0,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										-
11.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	39,74	3,00			0,00	119,22	-	-	0,00
11.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	319,99	3,00			0,00	959,97	-	-	0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										-
12.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43,65	10,00		10,00	10,00	436,50	-	436,50	436,50
Valor do Boletim: VINTE E NOVE MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS								R\$ 112.666,08	R\$ -	R\$ 29.168,16	R\$ 29.168,16

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.08.26 12:18:30
-03'00'


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626
685479
GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626885
479
2025.09.01
22:43:18-03'00'

01 98814-4071
01 98800-0188

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE

LOCALIDADE: VERTENTES-PE

DATA: 25/06/2024



FOTO 1: EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

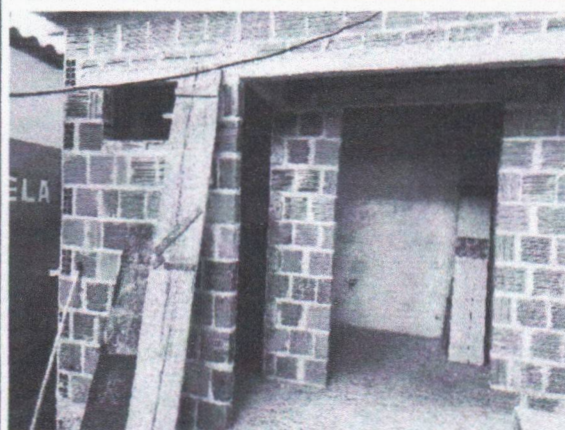


FOTO 2: EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

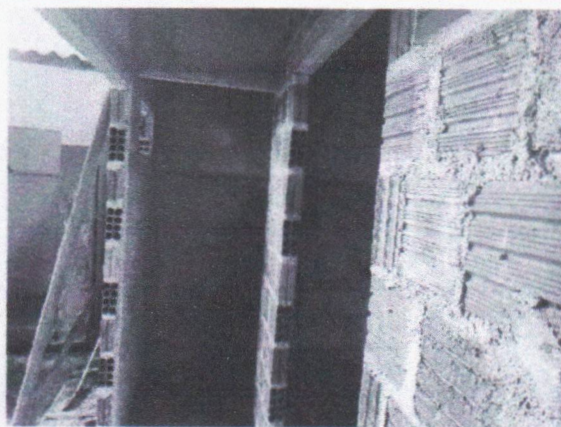


FOTO 3: EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

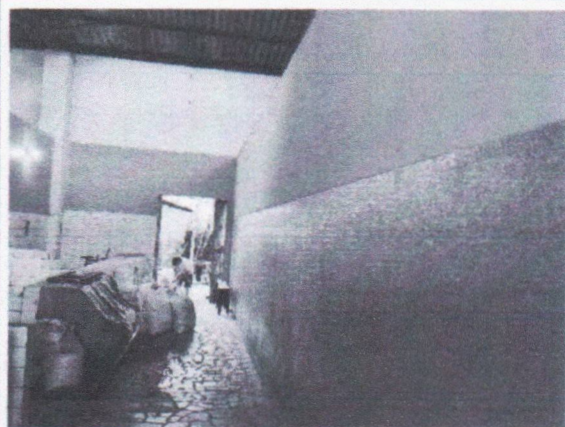


FOTO 4: PINTURA DO AÇOUGUE;



FOTO 5: PINTURA DO AÇOUGUE;



FOTO 6: PINTURA DO AÇOUGUE;

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479
2025.09.01 22:43:18-03'00'

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.08.26 12:20:19
-03'00'

Gertúlio Amoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.264-77
Portaria N°: 091/2024
