



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: AMS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 57.016.028/0001-34

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES

CONTRATO Nº 090/2023

DATA DE ELABORAÇÃO: 22/09/2025

ITEM	Codigo	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
						PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM
1.0			UBS SERRA DA CACHOEIRA										
1.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS										
1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$ 14,15	35,17			0,00	R\$ 497,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$ 5,18	35,17			0,00	R\$ 182,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA	M2	R\$ 46,76	35,17			0,00	R\$ 1.644,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2			PINTURA										
1.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 11,99	473,89			0,00	R\$ 5.881,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 14,80	103,60			0,00	R\$ 1.503,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 31,54	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$ 10,56	9,04			0,00	R\$ 95,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3			ESQUADRIAS										
1.3.1	8664	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, REV-01_05/2024	M2	R\$ 736,15	2,52			0,00	R\$ 1.855,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
1.4.1	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CURVA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	R\$ 527,46	1,00			0,00	R\$ 527,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0			UBS JAIME JUSTINIANO DE SANTANA (Danilo Andrade)										
2.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS										
2.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$ 14,15	45,50			0,00	R\$ 643,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$ 5,18	45,50			0,00	R\$ 236,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$ 46,76	45,50			0,00	R\$ 2.127,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1			PINTURA										
2.1.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 11,99	470,28			0,00	R\$ 5.638,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 14,80	165,55			0,00	R\$ 2.460,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 31,54	48,63			0,00	R\$ 1.533,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:11626
685479
GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162685479
2025.09.22
23:42:02-03'00'

AMB CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:570160280001
34

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:57016028000134
Dados: 2025.09.22 13:08:05
-03'00'

CNPJ 16.256.887/0001-60 01 99814-0011 01 8506-0185 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

2.1.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	48,93			0,00	R\$	518,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2			LOUÇAS SANITÁRIAS															
2.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	R\$	587,30	4,00			0,00	R\$	2.349,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3			GRADES															
2.3.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	M2	R\$	854,14	1,57			0,00	R\$	1.340,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4			PAVIMENTAÇÃO															
2.4.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$	100,51	85,00			0,00	R\$	8.543,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.0			REFORMA DO PSF DEUSDEDE ALVES CELESTINO - DISTRITO DE CAPELA NOVA															
3.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
3.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$	14,15	17,37			0,00	R\$	245,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	35,83			0,00	R\$	165,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	35,83			0,00	R\$	1.875,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2			PINTURA															
3.2.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	R\$	25,26	55,70			0,00	R\$	1.406,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	238,52			0,00	R\$	2.859,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2.3	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	41,58			0,00	R\$	439,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	37,19			0,00	R\$	550,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3			ESQUADRIAS															
3.3.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	M2	R\$	291,30	2,34			0,00	R\$	681,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.4			TELHADO															
3.4.1	100326	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M2	R\$	17,34	141,95			0,00	R\$	2.461,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.4.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	R\$	173,30	7,50			0,00	R\$	1.299,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.0			REFORMA DO PSF DO DISTRITO DO SÃO JOÃO DO FERRAZ															
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
4.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$	14,15	20,34	20,34	20,34	20,34	R\$	287,81	R\$	-	R\$	287,81	R\$	287,81
4.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	20,34	20,34	20,34	20,34	R\$	105,36	R\$	-	R\$	105,36	R\$	105,36
4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	20,34	20,34	20,34	20,34	R\$	951,09	R\$	-	R\$	951,09	R\$	951,09
4.1.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	M2	R\$	77,37	109,98	109,98	109,98	109,98	R\$	8.509,15	R\$	-	R\$	8.509,15	R\$	8.509,15
4.2			PINTURA															

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA
 11626685479
 2025.09.22
 685479

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

01 9914-4211
 01 9900-0189
 gabinete@vertentes.pe.gov.br
 Dr. Imídio Cavalcanti, nº 97
 CEP 55.770-050 | Centro | Vertentes-PE

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:57016028000
 134

Assinado de forma digital por
 AMB CONSTRUÇÕES E
 SERVIÇOS
 LTDA:57016028000134
 Dados: 2025.09.22 13:08:19
 +03'00'

4.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	11,99	188,69		188,69	188,69	R\$	2.262,39	R\$	-	R\$	2.262,39	R\$	2.262,39
4.2.2	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$	10,56	36,12		36,12	36,12	R\$	381,42	R\$	-	R\$	381,42	R\$	381,42
4.3			LOUÇAS SANITÁRIA															
4.3.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$	1.557,25	1,00		1,00	1,00	R\$	1.557,25	R\$	-	R\$	1.557,25	R\$	1.557,25
5.0			REFORMA DO PSF DO JUNCÓ															
5.1			PINTURA															
5.1.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	11,99	206,96			0,00	R\$	2.461,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	14,80	126,82			0,00	R\$	1.876,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$	31,54	77,20			0,00	R\$	2.434,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$	10,56	5,06			0,00	R\$	53,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
5.2.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	R\$	19,37	3,00			0,00	R\$	58,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3			REVESTIMENTO EM PAREDES															
5.3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$	14,15	54,04			0,00	R\$	764,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$	7,81	9,30			0,00	R\$	72,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	5,18	54,04			0,00	R\$	279,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3.4	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	31,93	54,04			0,00	R\$	1.725,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	R\$	77,37	54,04			0,00	R\$	4.161,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.0			UBS CRUZEIRO II (bairro São José)															
6.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
6.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$	14,15	20,00			0,00	R\$	283,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	5,18	20,00			0,00	R\$	103,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	46,76	20,00			0,00	R\$	935,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2			PINTURA															
6.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	11,99	386,51			0,00	R\$	4.562,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	14,80	123,38			0,00	R\$	1.826,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$	31,54	11,60			0,00	R\$	365,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Gertúlio Timoteo Bezerra

Sec. de Desenvolvimento

Urbano e Transportes

Vertentes-PE

CPF: 088.985.284-77

Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA: 11626
 685479

GUSTAVO DE ARAUJO
 LIMA: 1162685479
 2025.09.22
 23:42:02-03'00'

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA: 570160280001
 34

Assinado de forma digital por AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA: 57016028000134
 Dados: 2025.09.22 13:08:30 -03'00'

6.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	28,35			0,00	R\$	299,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.0			UBS NOVA MORADA															
7.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
7.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$	14,15	15,00			0,00	R\$	212,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	15,00			0,00	R\$	77,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	15,00			0,00	R\$	701,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2			PINTURA															
7.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	211,76			0,00	R\$	2.539,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	79,65			0,00	R\$	1.178,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	40,00			0,00	R\$	1.261,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	36,96			0,00	R\$	390,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.3			PAVIMENTAÇÃO															
7.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$	100,51	190,00			0,00	R\$	19.096,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.0			UBS RIACHO DIREITO															
8.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
8.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$	14,15	14,49			0,00	R\$	205,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	14,49			0,00	R\$	75,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	14,49			0,00	R\$	677,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2			PINTURA															
8.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	364,42			0,00	R\$	4.369,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	83,16			0,00	R\$	1.230,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	77,20			0,00	R\$	2.434,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	30,24			0,00	R\$	319,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.3			CORRIMÃO															
8.3.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019 PS	M2	R\$	117,65	8,00			0,00	R\$	941,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Valor do Boletim: QUATORZE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS											R\$	121.243,36	R\$	-	R\$	14.054,47	R\$	14.054,47



Gertúlio Timoteo Bezerra

 Sec. de Desenvolvimento

 Urbano e Transportes

 Vertentes-PE

 CPF: 083.985.284-77

 Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO

 GUSTAVO DE ARAUJO

 LIMA:11626

 2025.09.22

 685479

AMB CONSTRUÇÕES

 E SERVIÇOS

 LTDA:5701602800013

4

Assinado de forma digital por

 AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

 LTDA:57016028000134

 Dados: 2025.09.22 13:08:41

 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 01

CONTRATO N° 90/2025 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 055/2025 - DISPENSA N° 055/2025

OBRA: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) EM DIVERSAS LOCALIDADES
NO MUNICÍPIO DE VERTENTES





CNPJ
10.296.887/0001-60





81 99814-4011
81 9500-0189




gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

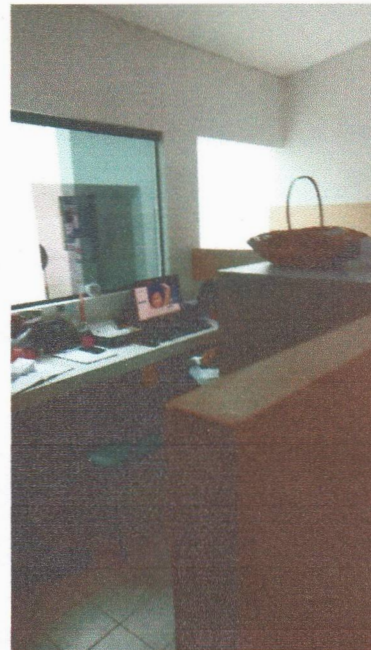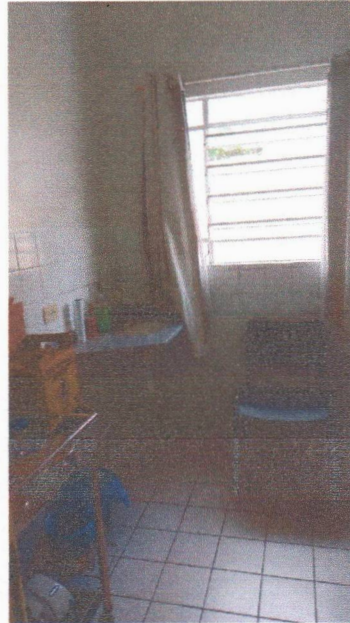



CNPJ
10.296.887/0001-60



81 99814-4011
81 9500-0189



gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE
