

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 57.016.028/0001-94
 LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE
 OBRA: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES
 CONTRATO Nº 090/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/09/2025

ITEM	Codigo	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
						PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM
1.0			UBS SERRA DA CACHOEIRA										
1.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS										
1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$ 14,15	35,17			0,00	R\$ 497,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$ 5,18	35,17			0,00	R\$ 182,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$ 46,76	35,17			0,00	R\$ 1.644,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2			PINTURA										
1.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 11,99	473,89			0,00	R\$ 5.681,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 14,80	101,60			0,00	R\$ 1.503,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 31,54	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	102206	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$ 10,56	9,04			0,00	R\$ 95,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3			ESQUADRIAS										
1.3.1	8664	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, REV-01_05/2024	M2	R\$ 736,15	2,52			0,00	R\$ 1.855,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
1.4.1	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	R\$ 527,46	1,00			0,00	R\$ 527,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0			UBS JAIME JUSTINIANO DE SANTANA (Danilo Andrade)										
2.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS										
2.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$ 14,15	45,50			0,00	R\$ 643,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$ 5,18	45,50			0,00	R\$ 235,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$ 46,76	45,50			0,00	R\$ 2.127,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1			PINTURA										
2.1.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 11,99	470,28			0,00	R\$ 5.638,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 14,80	165,55			0,00	R\$ 2.450,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GUSTAVO DE ARAUJO
 DE ARAUJO LIMA: 116266854
 LIMA: 1162679
 2025.09.29
 08:31:55-03'00'

Gerônimo Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

AMB CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS
 LTDA: 57016028000134
 134

Assinado de forma digital
 por AMB CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS
 LTDA: 57016028000134
 Dados: 2025.09.25
 11:01:03 -03'00'

2.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$	31,54	48,63			0,00	R\$	1.533,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$	10,56	48,93			0,00	R\$	516,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2			LOUÇAS SANITÁRIAS															
2.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$	587,30	4,00			0,00	R\$	2.349,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3			GRADES															
2.3.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	R\$	854,14	1,57			0,00	R\$	1.340,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4			PAVIMENTAÇÃO															
2.4.1	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$	100,51	85,00			0,00	R\$	8.543,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.0			REFORMA DO PSF DEUSDEDE ALVES CELESTINO - DISTRITO DE CAPELA NOVA															
3.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
3.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$	14,15	17,37		17,37	17,37	R\$	245,78	R\$	-	R\$	245,78	R\$	245,78
3.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	5,18	35,83		35,83	35,83	R\$	165,52	R\$	-	R\$	185,60	R\$	185,60
3.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	46,76	35,83		35,83	35,83	R\$	1.675,41	R\$	-	R\$	1.675,41	R\$	1.675,41
3.2			PINTURA															
3.2.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$	25,26	55,70		55,70	55,70	R\$	1.406,98	R\$	-	R\$	1.406,98	R\$	1.406,98
3.2.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	11,99	238,52		238,52	238,52	R\$	2.859,85	R\$	-	R\$	2.859,85	R\$	2.859,85
3.2.3	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$	10,56	41,58		41,58	41,58	R\$	439,08	R\$	-	R\$	439,08	R\$	439,08
3.2.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	14,80	37,19		37,19	37,19	R\$	550,41	R\$	-	R\$	550,41	R\$	550,41
3.3			ESQUADRIAS															
3.3.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	R\$	291,30	2,34		2,34	2,34	R\$	681,64	R\$	-	R\$	681,64	R\$	681,64
3.4			TELHADO															
3.4.1	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$	17,34	141,95		141,95	141,95	R\$	2.461,41	R\$	-	R\$	2.461,41	R\$	2.461,41
3.4.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$	173,30	7,50		7,50	7,50	R\$	1.299,75	R\$	-	R\$	1.299,75	R\$	1.299,75
4.0			REFORMA DO PSF DO DISTRITO DO SÃO JOÃO DO FERRAZ															
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
4.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$	14,15	20,34		20,34	20,34	R\$	287,81	R\$	287,81	R\$	-	R\$	287,81
4.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	5,18	20,34		20,34	20,34	R\$	105,36	R\$	105,36	R\$	-	R\$	105,36
4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	46,76	20,34		20,34	20,34	R\$	951,09	R\$	951,10	R\$	-	R\$	951,09

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA:1162679
08:31:55-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 089.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 57
CNP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

AMB CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:570160280001
34

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:57016028000134
Data: 2025.09.25 11:01:15
-03'00"

4.1.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 - PE	M2	R\$	77,37	109,98	109,98		109,98	R\$	8.509,15	R\$	8.509,15	R\$	-	R\$	8.509,15
4.2			PINTURA															
4.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,99	188,69	188,69		188,69	R\$	2.262,39	R\$	2.262,39	R\$	-	R\$	2.262,39
4.2.2	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	R\$	10,56	36,12	36,12		36,12	R\$	381,42	R\$	381,43	R\$	-	R\$	381,42
4.3			LOUÇAS SANITÁRIA															
4.3.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$	1.557,25	1,00	1,00		1,00	R\$	1.557,25	R\$	1.557,25	R\$	-	R\$	1.557,25
5.0			REFORMA DO P&F DO JUNCÓ															
5.1			PINTURA															
5.1.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,99	206,96		206,96	206,96	R\$	2.481,45	R\$	-	R\$	2.481,45	R\$	2.481,45
5.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	14,80	126,82		126,82	126,82	R\$	1.876,93	R\$	-	R\$	1.876,94	R\$	1.876,94
5.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	R\$	31,54	77,20		77,20	77,20	R\$	2.434,88	R\$	-	R\$	2.434,89	R\$	2.434,89
5.1.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	R\$	10,56	5,06		5,06	5,06	R\$	53,43	R\$	-	R\$	53,43	R\$	53,43
5.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
5.2.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UND	R\$	19,37	3,00		3,00	3,00	R\$	58,11	R\$	-	R\$	58,11	R\$	58,11
5.3			REVESTIMENTO EM PAREDES															
5.3.1	97631	SINAPI	DEVOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	14,15	54,04		54,04	54,04	R\$	764,66	R\$	-	R\$	764,67	R\$	764,67
5.3.2	97634	SINAPI	DEVOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	7,81	9,30		9,30	9,30	R\$	72,63	R\$	-	R\$	72,63	R\$	72,63
5.3.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$	5,18	54,04		54,04	54,04	R\$	279,92	R\$	-	R\$	279,93	R\$	279,93
5.3.4	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	R\$	31,93	54,04		54,04	54,04	R\$	1.725,49	R\$	-	R\$	1.725,50	R\$	1.725,50
5.3.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 - PE	M2	R\$	77,37	54,04		54,04	54,04	R\$	4.181,07	R\$	-	R\$	4.181,07	R\$	4.181,07
6.0			UBS CRUZEIRO II (bairro São José)															
6.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
6.1.1	97631	SINAPI	DEVOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	14,15	20,00		0,00	0,00	R\$	283,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$	5,18	20,00		0,00	0,00	R\$	103,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	R\$	46,76	20,00		0,00	0,00	R\$	935,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2			PINTURA															
6.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,99	380,51		0,00	0,00	R\$	4.562,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-

GUSTAVO DE ARAUJO
 DE ARAUJO LIMA: 11626854
 LIMA: 1162679
 685479 2025.09.29
 08:31:55-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria N°: 091/2024

11 08814-1011 0800-0186 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 Centro | Vertentes-PE

AMB
 CONSTRUÇÕES E
 SERVIÇOS
 LTDA: 57016028000
 134

Assinado de forma digital
 por AMB CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS
 LTDA: 57016028000134
 Dados: 2025.09.25
 11:01:26 -03'00"

6.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	123,38		0,00	R\$	1.826,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
6.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	11,60		0,00	R\$	365,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
6.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	28,35		0,00	R\$	299,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.0			UBS NOVA MORADA															
7.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
7.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$	14,15	15,00		0,00	R\$	212,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	15,00		0,00	R\$	77,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	15,00		0,00	R\$	701,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.2			PINTURA															
7.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	211,76		0,00	R\$	2.539,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	79,65		0,00	R\$	1.178,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	40,00		0,00	R\$	1.261,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	36,96		0,00	R\$	390,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7.3			PAVIMENTAÇÃO															
7.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$	100,51	190,00		0,00	R\$	19.096,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.0			UBS RIACHO DIREITO															
8.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
8.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	R\$	14,15	14,49		0,00	R\$	205,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	14,49		0,00	R\$	75,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	14,49		0,00	R\$	677,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.2			PINTURA															
8.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	364,42		0,00	R\$	4.369,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	83,16		0,00	R\$	1.230,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	77,20		0,00	R\$	2.434,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	30,24		0,00	R\$	319,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.3			CORRIMÃO															
8.3.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019 PS	M2	R\$	117,65	8,00		0,00	R\$	941,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Valor do Boletim: VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS											R\$	121.243,36	R\$	14.054,49	R\$	25.734,54	R\$	39.789,01

GUSTAVO GUSTAVO DE
 ARAUJO ARAUJO
 DE ARAUJO LIMA:116268854
 LIMA:1162679
 685479 2025.09.29
 08:31:55-03'00'

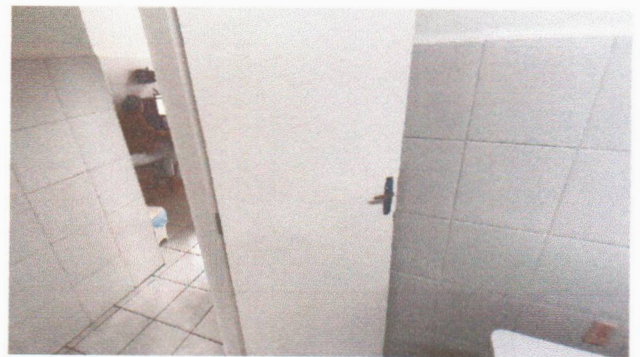
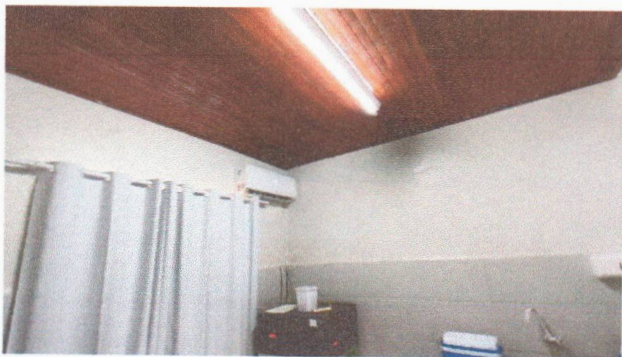

Gerúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.264-77
 Portaria Nº: 091/2024

Assinado de forma digital
 por AMB CONSTRUCOES E
 SERVICOS
 LTDA:57016028000134
 Dados: 2025.09.25
 11:01:41-03'00'

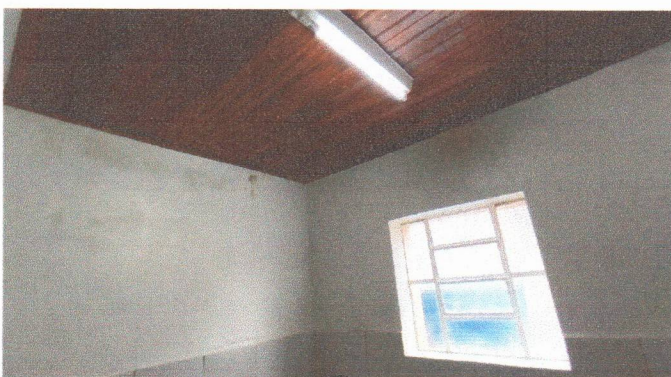
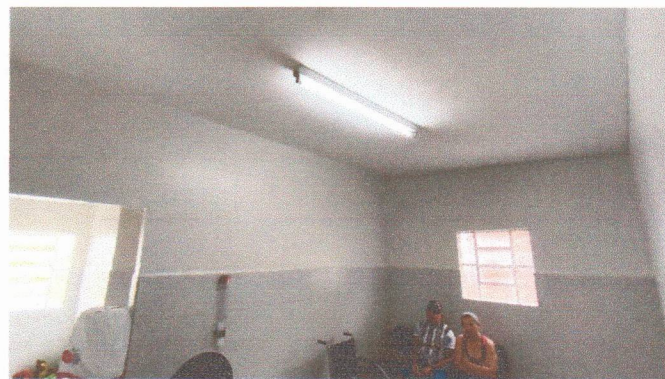
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 02

CONTRATO N° 90/2025 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 055/2025 - DISPENSA N° 055/2025

OBRA: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE VERTENTES




Gertúlio Amoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024



Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024
